RioTinto

Rencontre du comité des parties prenantes

24 mars 2022

Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean

Agenda – 24 mars 2022 (2h de rencontre)

Agenda	Objectif de l'échange	Durée	Responsables
• Introduction et suivi	Information	5 minutes	Richard
• Gestion hydrique – gestion printanière	Information et échange	20 minutes	Jean
• Survol du bilan annuel sur le PSBLSJ	Information et échange	25 minutes	Caroline et Richard
• Secteurs sous surveillance 2022	Information et consultation	10 minutes	Caroline
• Mise à jour sur la réalisation des sites de travaux et prochaines étapes	Information et échange	20 minutes	Caroline
• Dossier Saint-Gédéon-sur-le-Lac et Belle Rivière	Information et échange	25 minutes	Richard et Caroline
• Questions et varia – Prochaines rencontres et sujets d'intérêt		15 minutes	Tous

Retour sur la rencontre du 9 décembre 2021

– Envoyer aux participants le lien vers les archives du BAPE sur les travaux de Belle Rivière – Dans le compte-rendu de la rencontre sur le site internet d'ÉÉ

Depuis notre dernière rencontre (9 décembre au 24 mars)

Travaux

- Travaux: première phase complétée
- Réception des rapports d'analyse de SGSLL/BR et du suivi technique 2021 des travaux de l'hiver 2019 à la BR
- Préparation des travaux d'entretien
- Arpentage annuel de plage publié sur Geoctopus

Consultation

- Information sur le début des travaux
- SGSLL/BR: Rencontres avec MELCC, MFFP et MPO et parties prenantes
- SGSLL/BR: mise en place d'un comité aviseur
- Bilan annuel déposé au MELCC

Rencontres

- SGSLL/BR: maire, marina et association de riverains
- Tournée municipale débutée (Dolbeau-Mistassini et Péribonka)
- Conseil de gestion durable
- Comité scientifique
- 23 rencontres avec les parties prenantes

Autres

- Niveau du lac Saint-Jean hiverval différent

Gestion hydrique

– Gestions printanière

Préparé par
Jean Paquin, ing.

Gestion de l’hiver 2021-2022

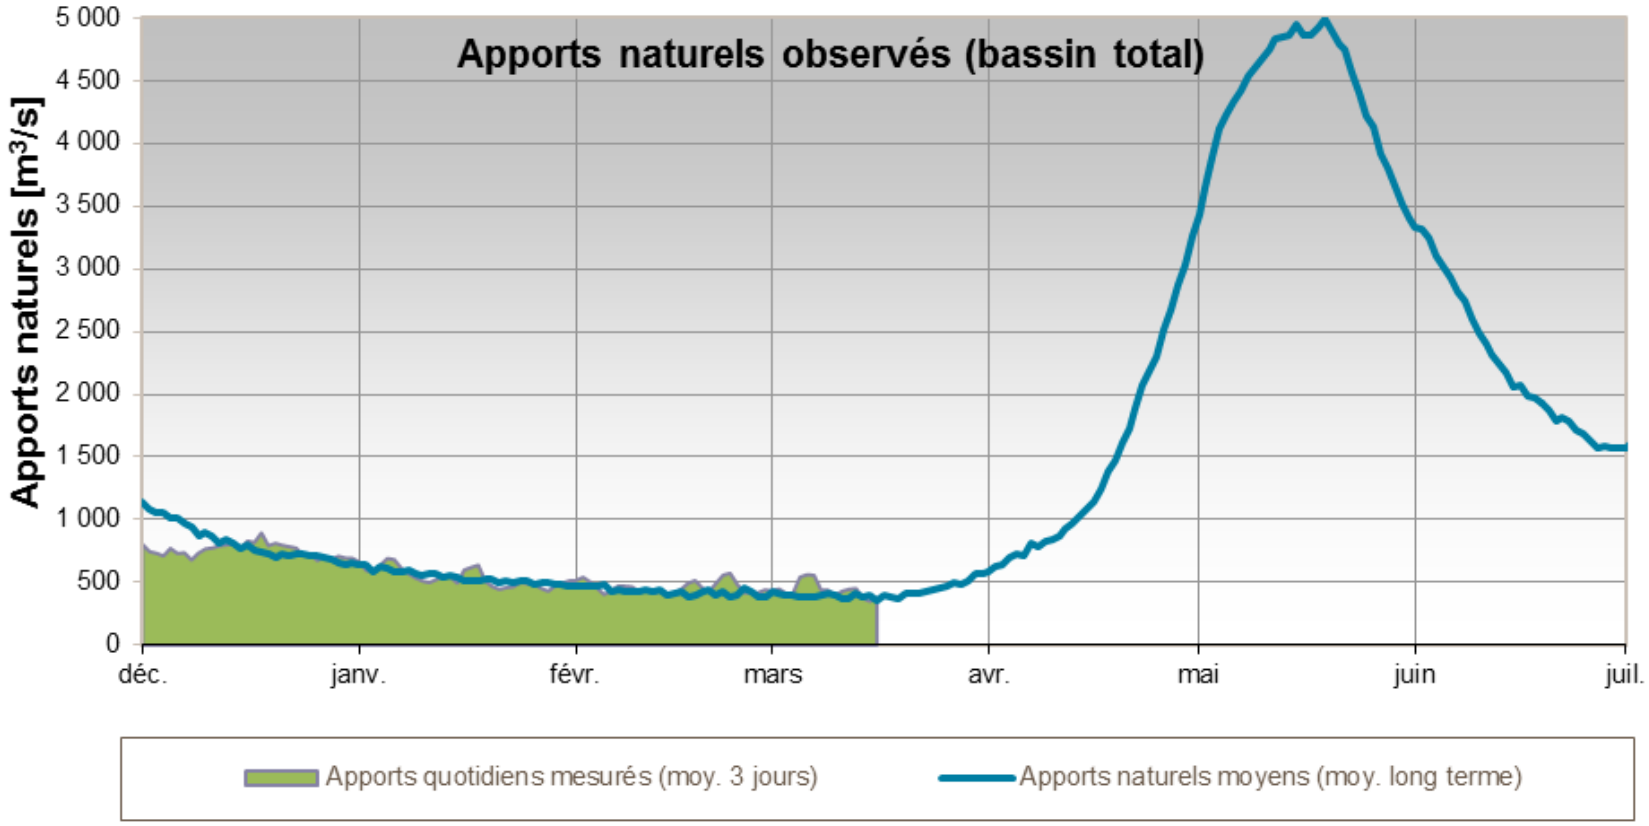

Apports observés		
Période	**[m³/s]**	**% normale 1953-2021**
Décembre 2021	755	89%
Janvier 2022	539	97%
Février 2022	461	106%
Mars 2022	430	107%
Hiver	559	97%

Précipitations observées		
Période	**[mm]**	**% normale 1992-2021**
Décembre 2021	67	103%
Janvier 2022	50	96%
Février 2022	68	173%
Mars 2022	29	91%
Hiver	215	113%

Gestion de l'hiver 2021-2022

7.00 pi. (98.65 m) - Normale : 3,8 pi.

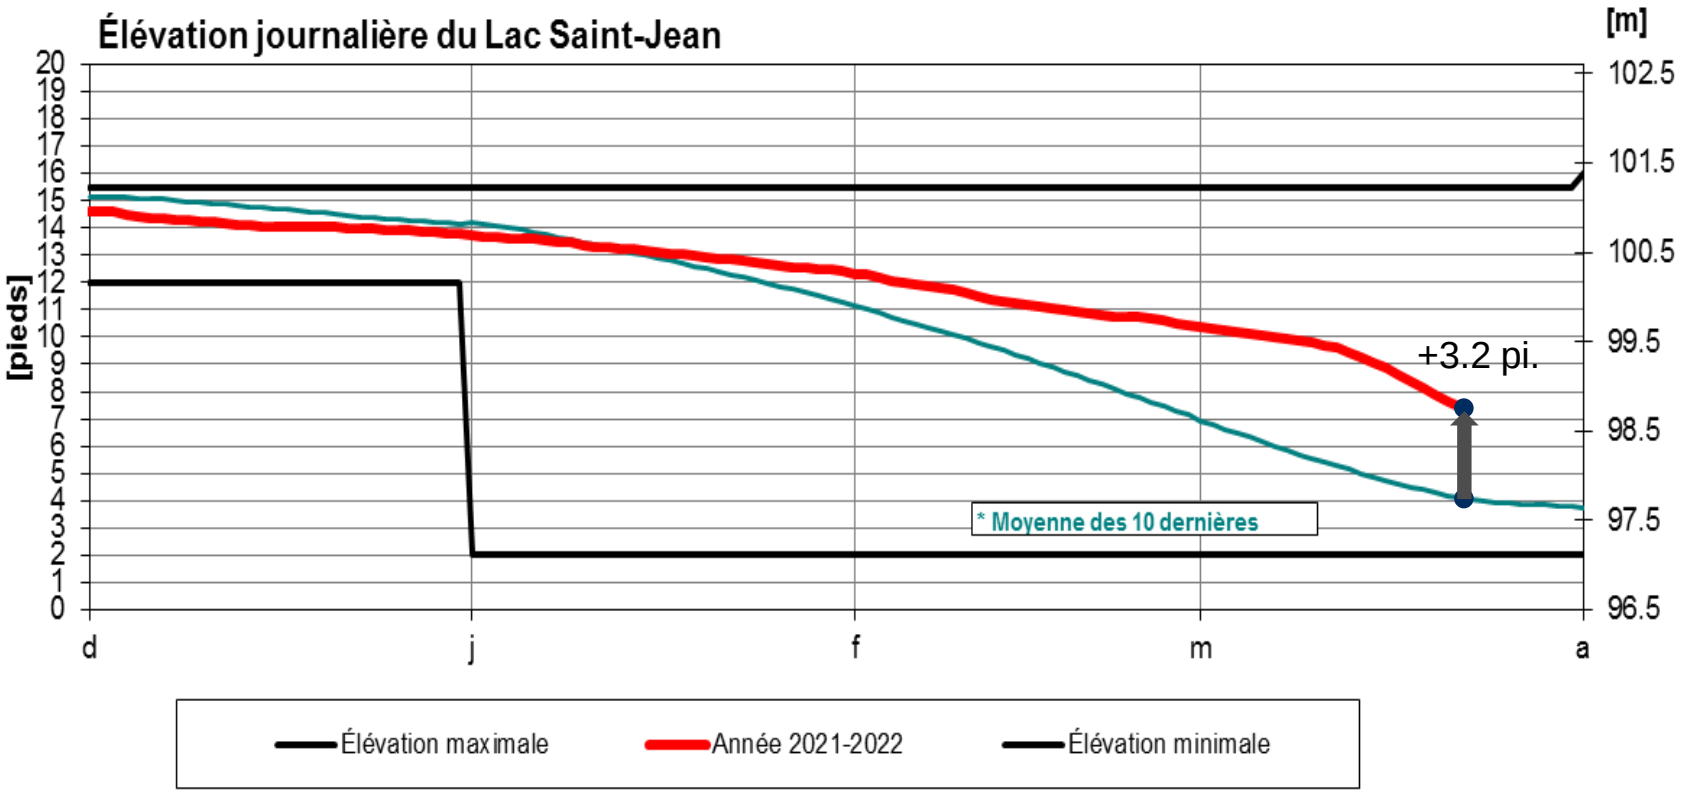

Apports observés		
Période	**[m³/s]**	**% normale 1953-2021**
Décembre 2021	755	89%
Janvier 2022	539	97%
Février 2022	461	106%
Mars 2022	430	107%
Hiver	559	97%

Précipitations observées		
Période	**[mm]**	**% normale 1992-2021**
Décembre 2021	67	103%
Janvier 2022	50	96%
Février 2022	68	173%
Mars 2022	29	91%
Hiver	215	113%

- LSJ actuellement plus haut que la normale (+3.2 pi.)
- *Objectif :* Permettre la réalisation de travaux à la Centrale Chute-des-Passes (avril-mai)

Pas de risque additionnel par rapport au respect de la limite d'opération

Neige au sol au 23 mars 2022

(mm)

Bassin total (73 800 km²)

117 % normale (fin février)

Mesure en continu de l'évolution de la neige au sol

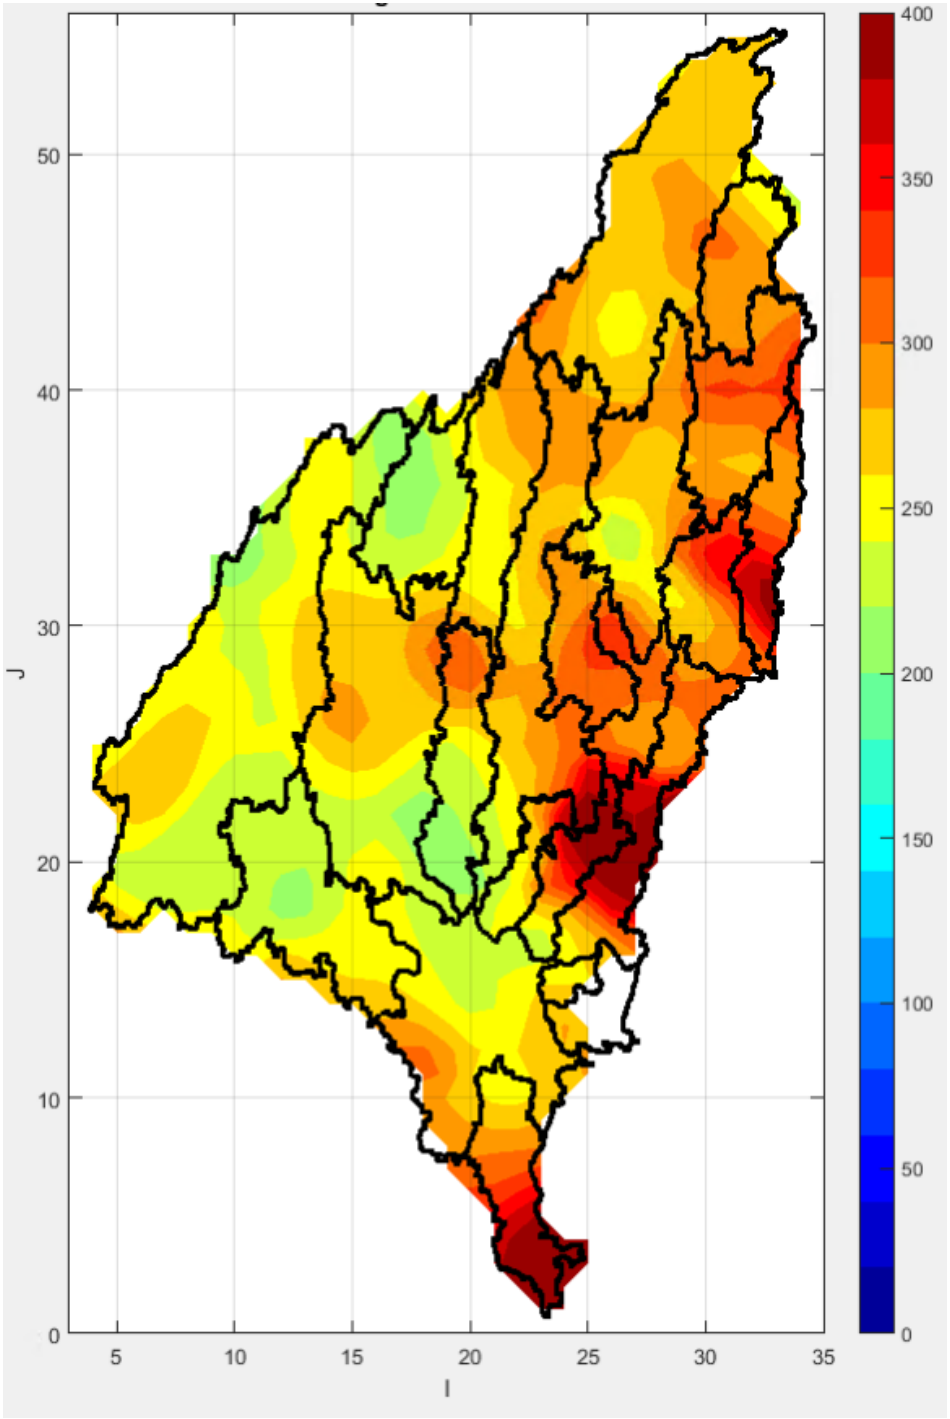

Précipitations des 30 derniers jours

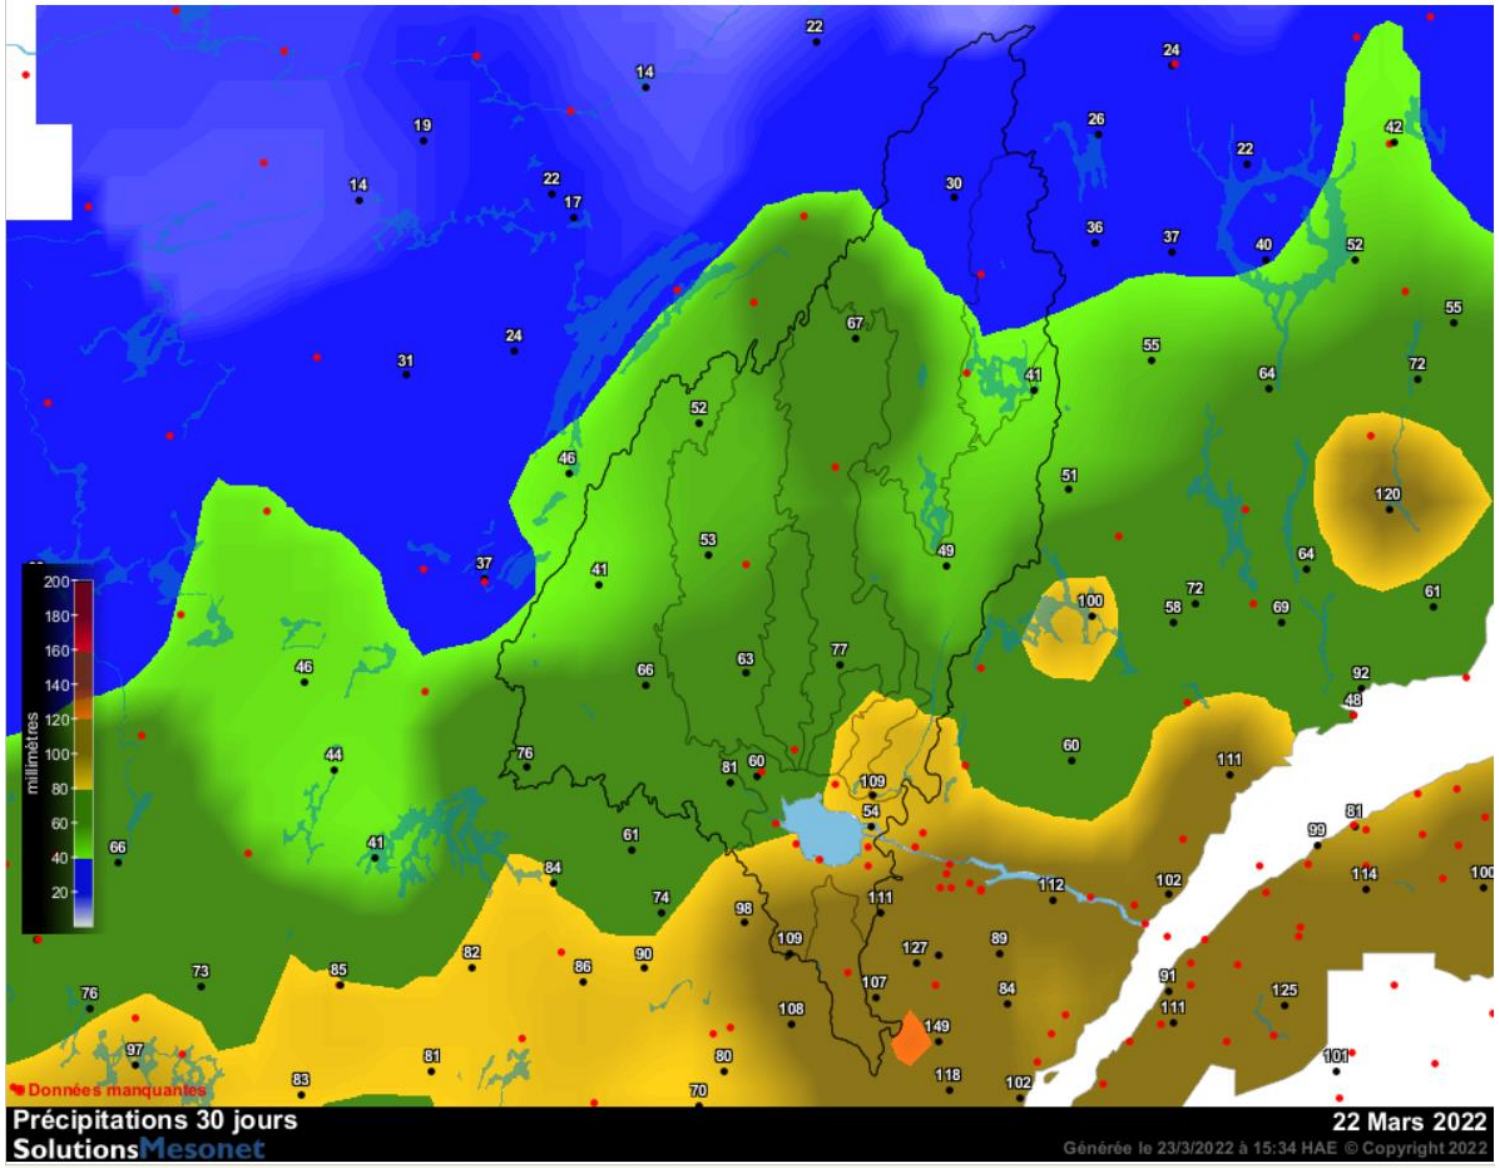

Prévision du ruissellement naturel

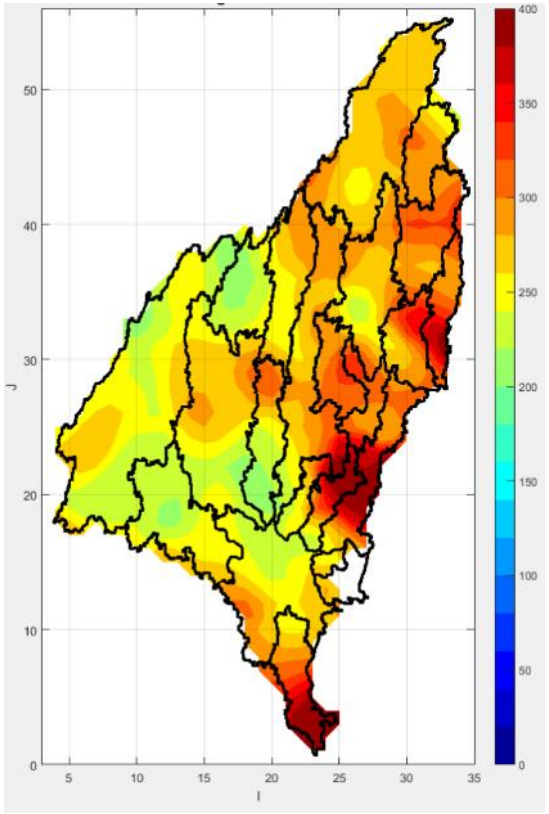

La neige explique **60%** du volume de crue

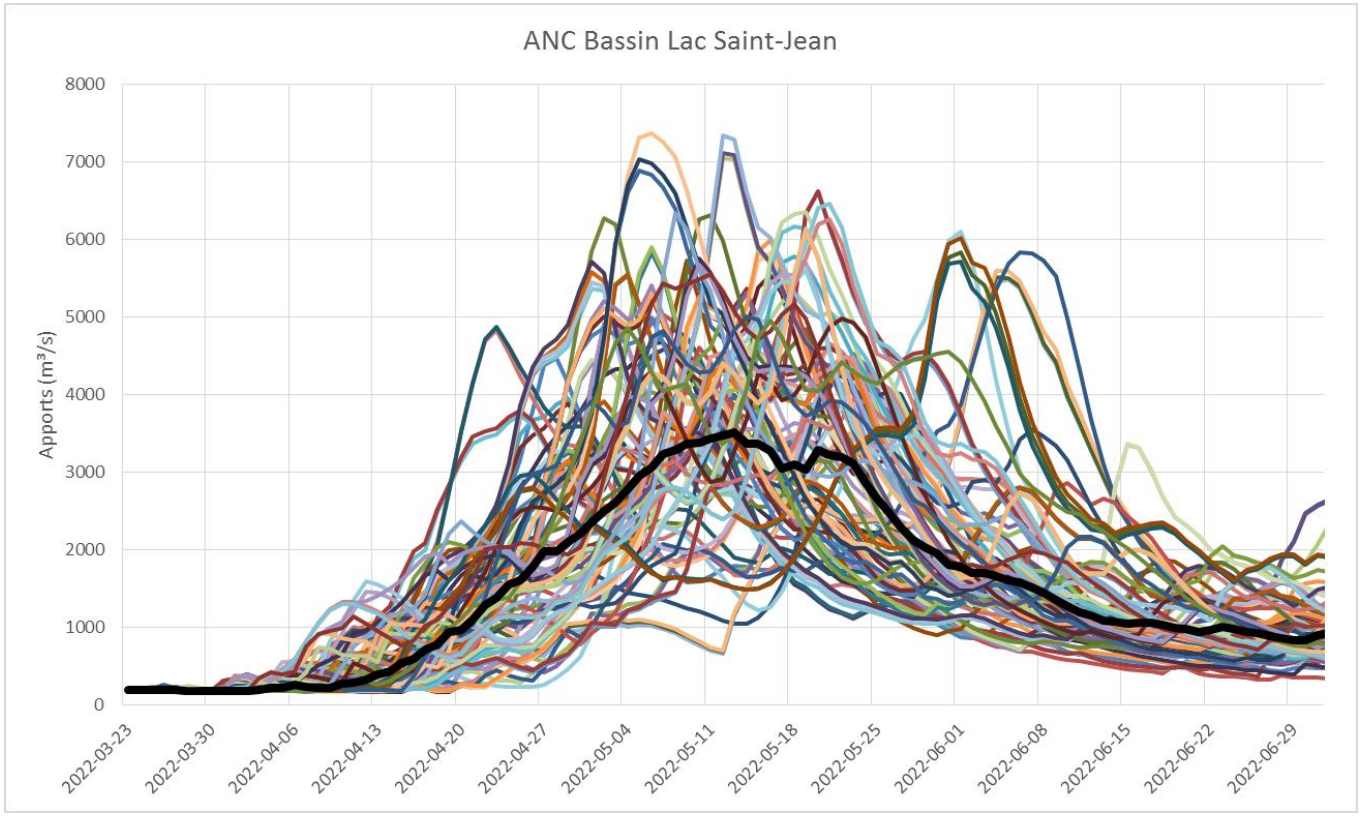

- Beaucoup d'incertitude sur la prochaine crue printanière (variable selon les conditions météo du printemps)
- La gestion vise à protéger les cas forts comme les cas faibles

Équipements de contrôle (évacuateurs) du lac Saint-Jean

80% des années, la crue est gérée avec moins de 16 vannes utilisées sur les 34

Capacité d'évacuation au LSJ : 34 vannes

Nom	Rivière	Nombre vannes
No. 5	Petite Décharge	2
No. 7	Petite Décharge	3
No .4	Grande Décharge	11
No. 3	Grande Décharge	12
No. 1	Grande Décharge	6
	Total	**34**

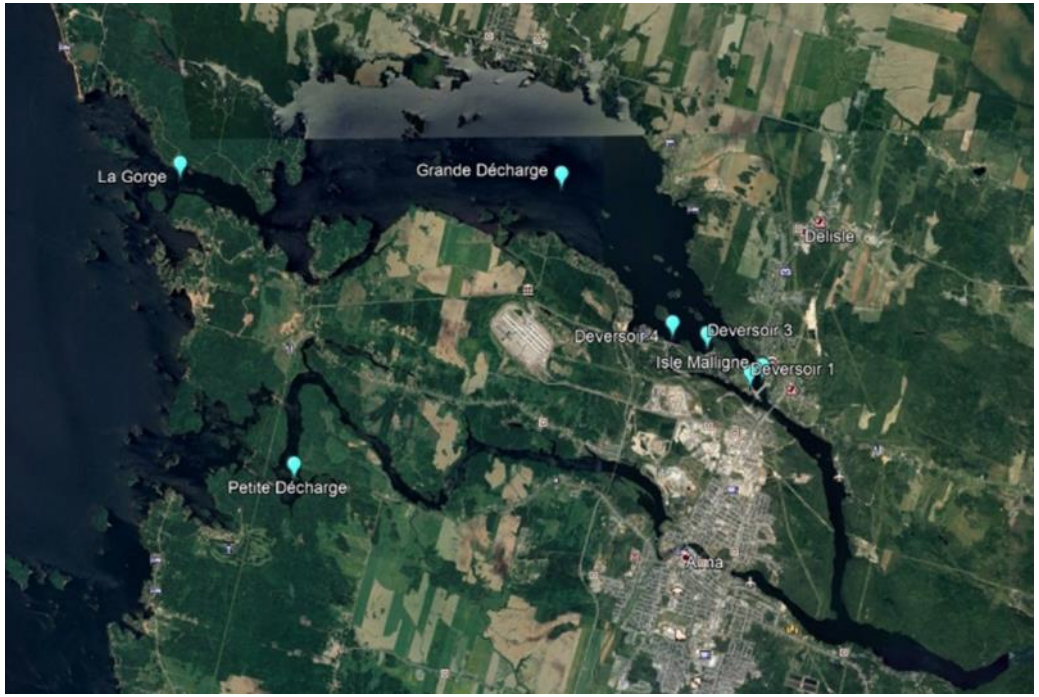

Projection du lac Saint-Jean crue 2022

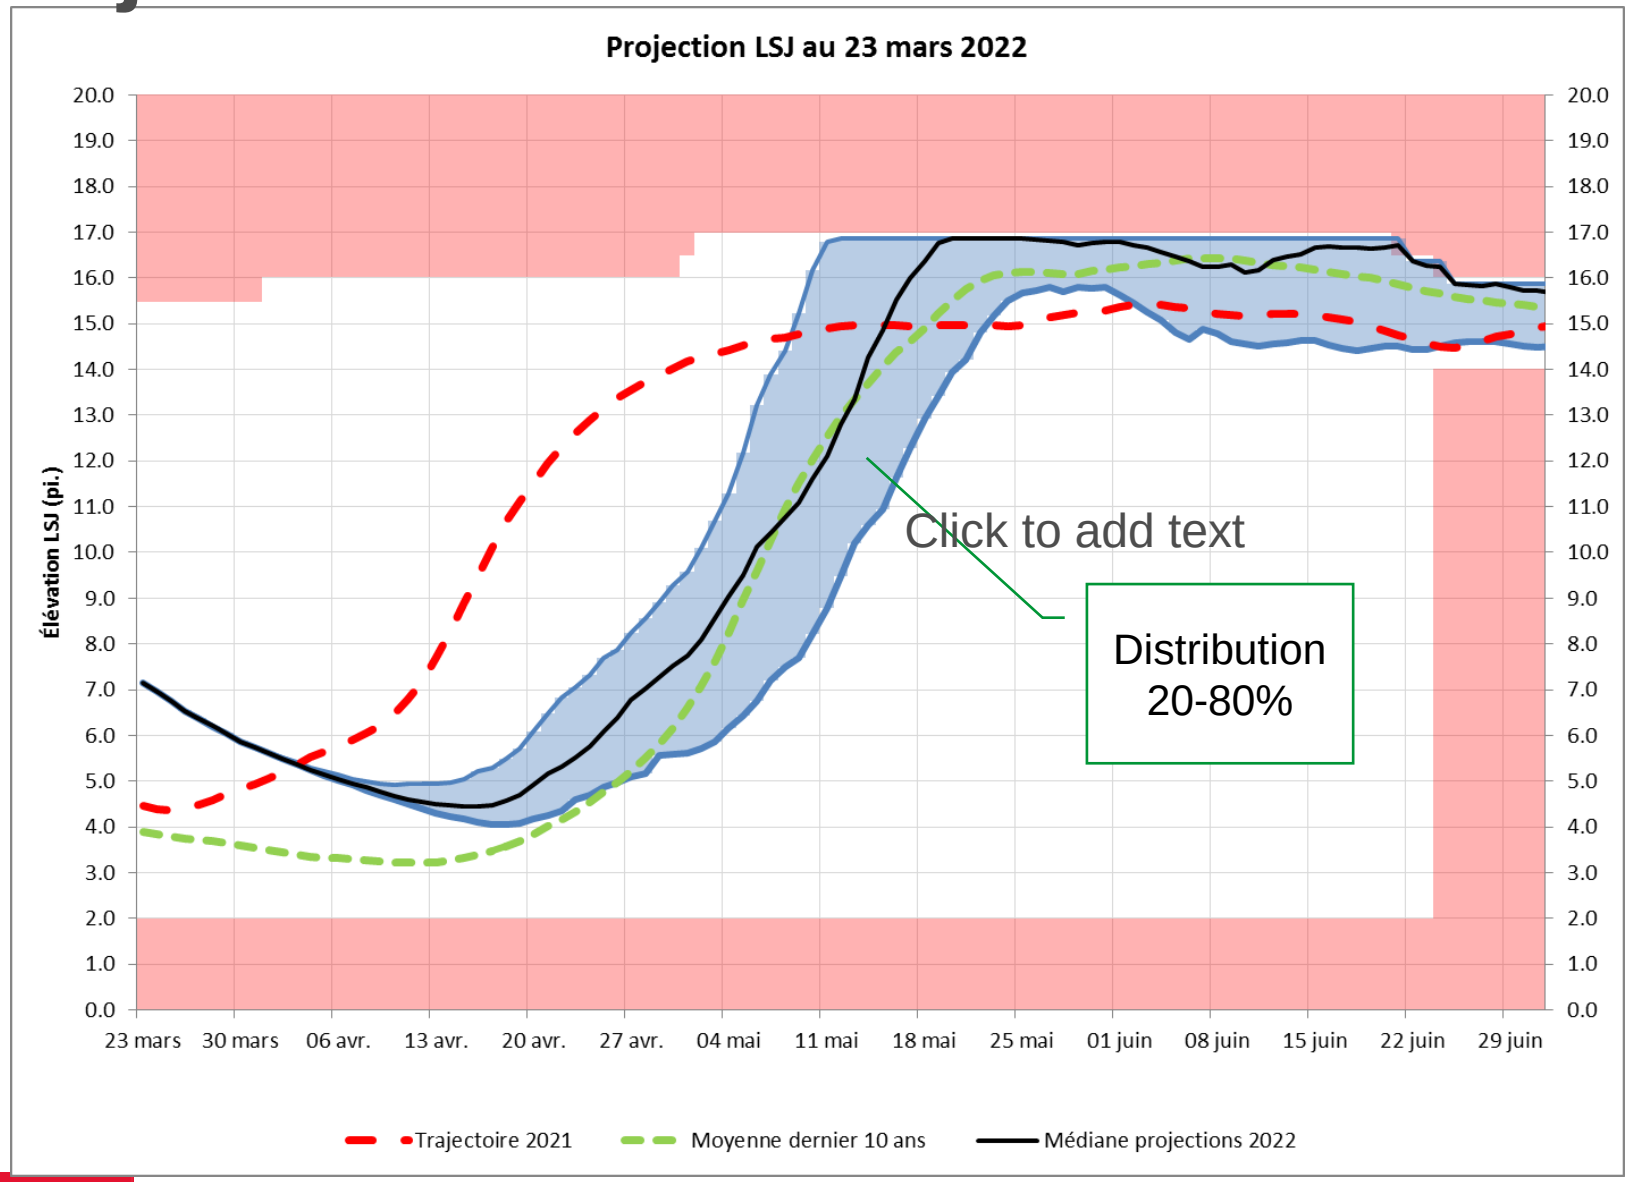

- Travaux à la Centrale Chute-des-Passes : nécessité d'avoir un LSJ plus haut en avril
- Probabilité actuelle de contrôler LSJ dans ses limites d'opération : **90%** *(attribuable à la météo à venir)*
- Repositionnement selon la moyenne en mai avant atteinte du niveau maximum

Un niveau minimal du LSJ nécessaire pour déverser à grand débit

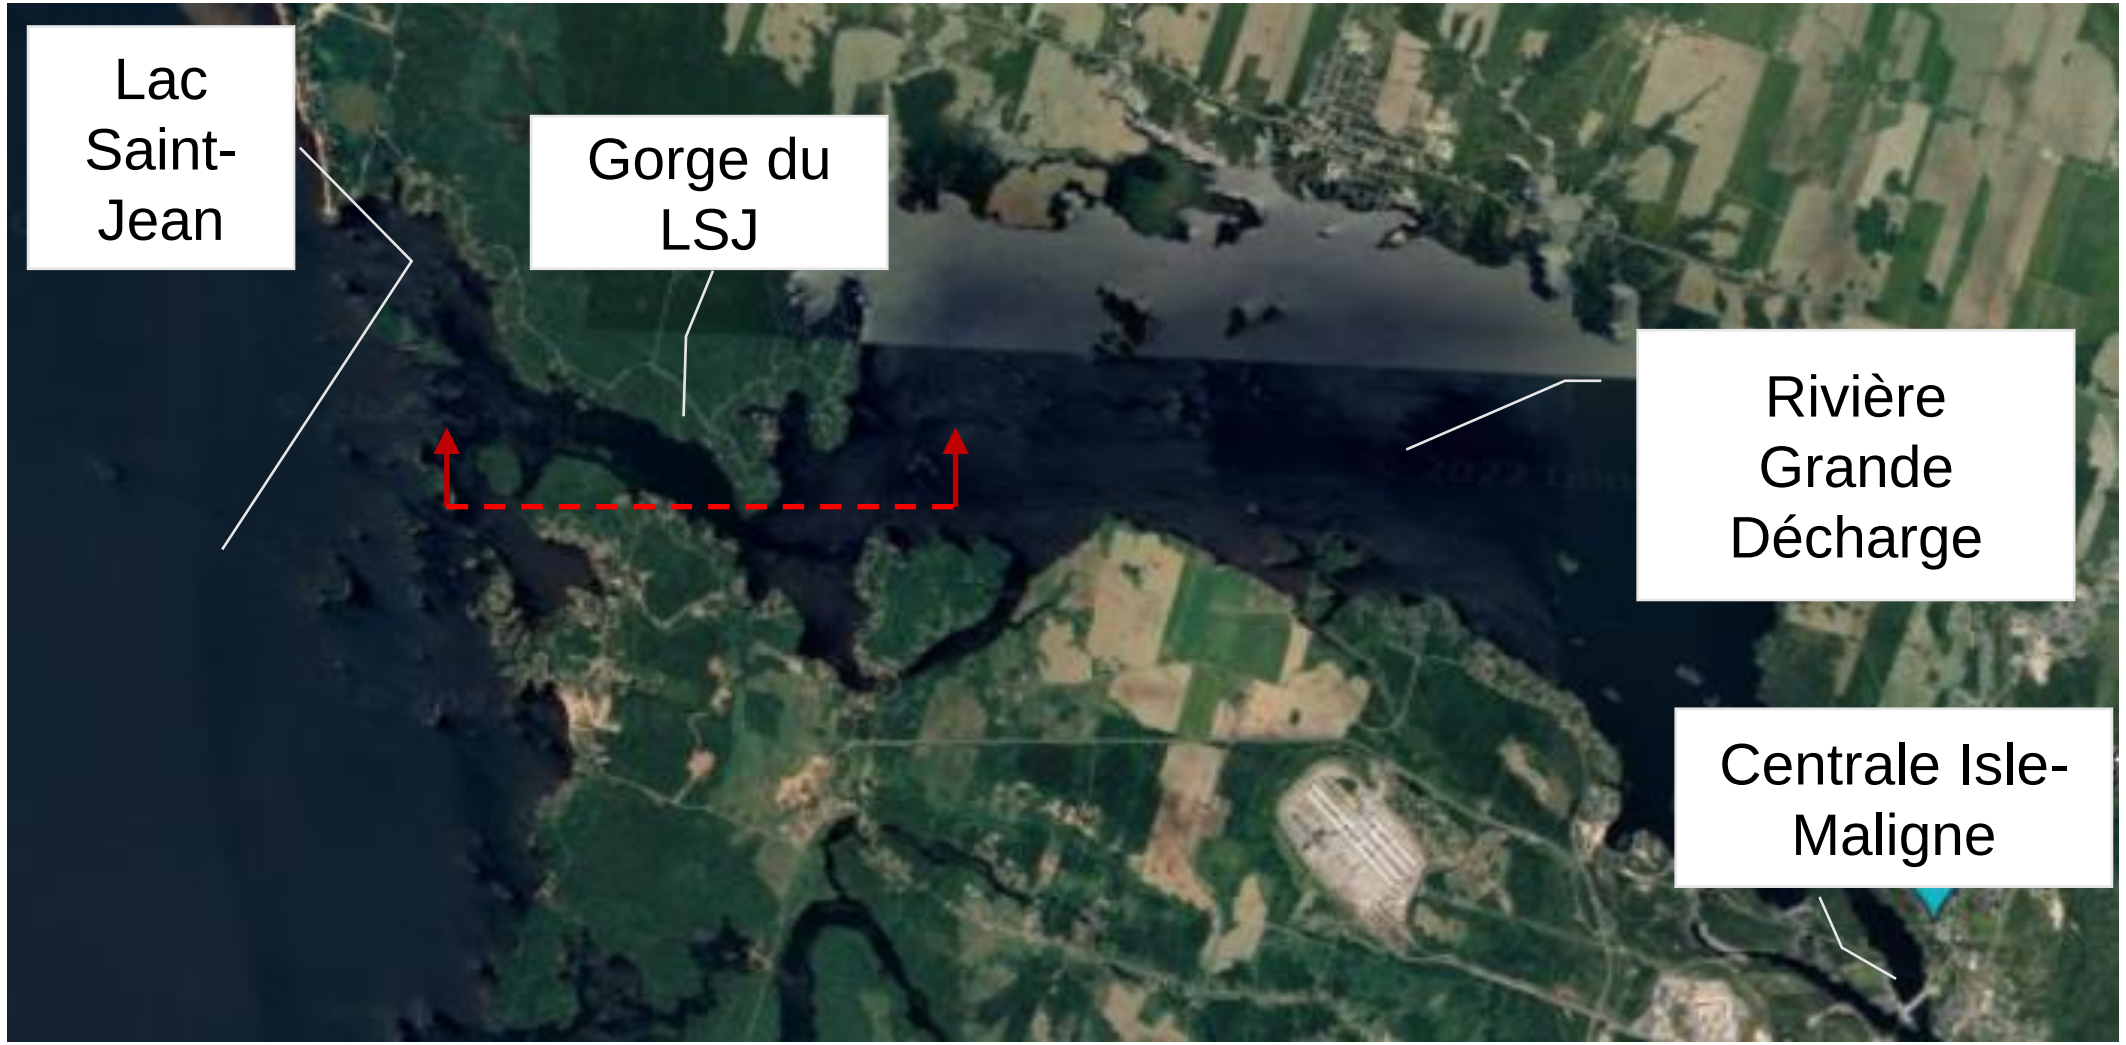

Un niveau minimal du LSJ nécessaire pour déverser à grand débit

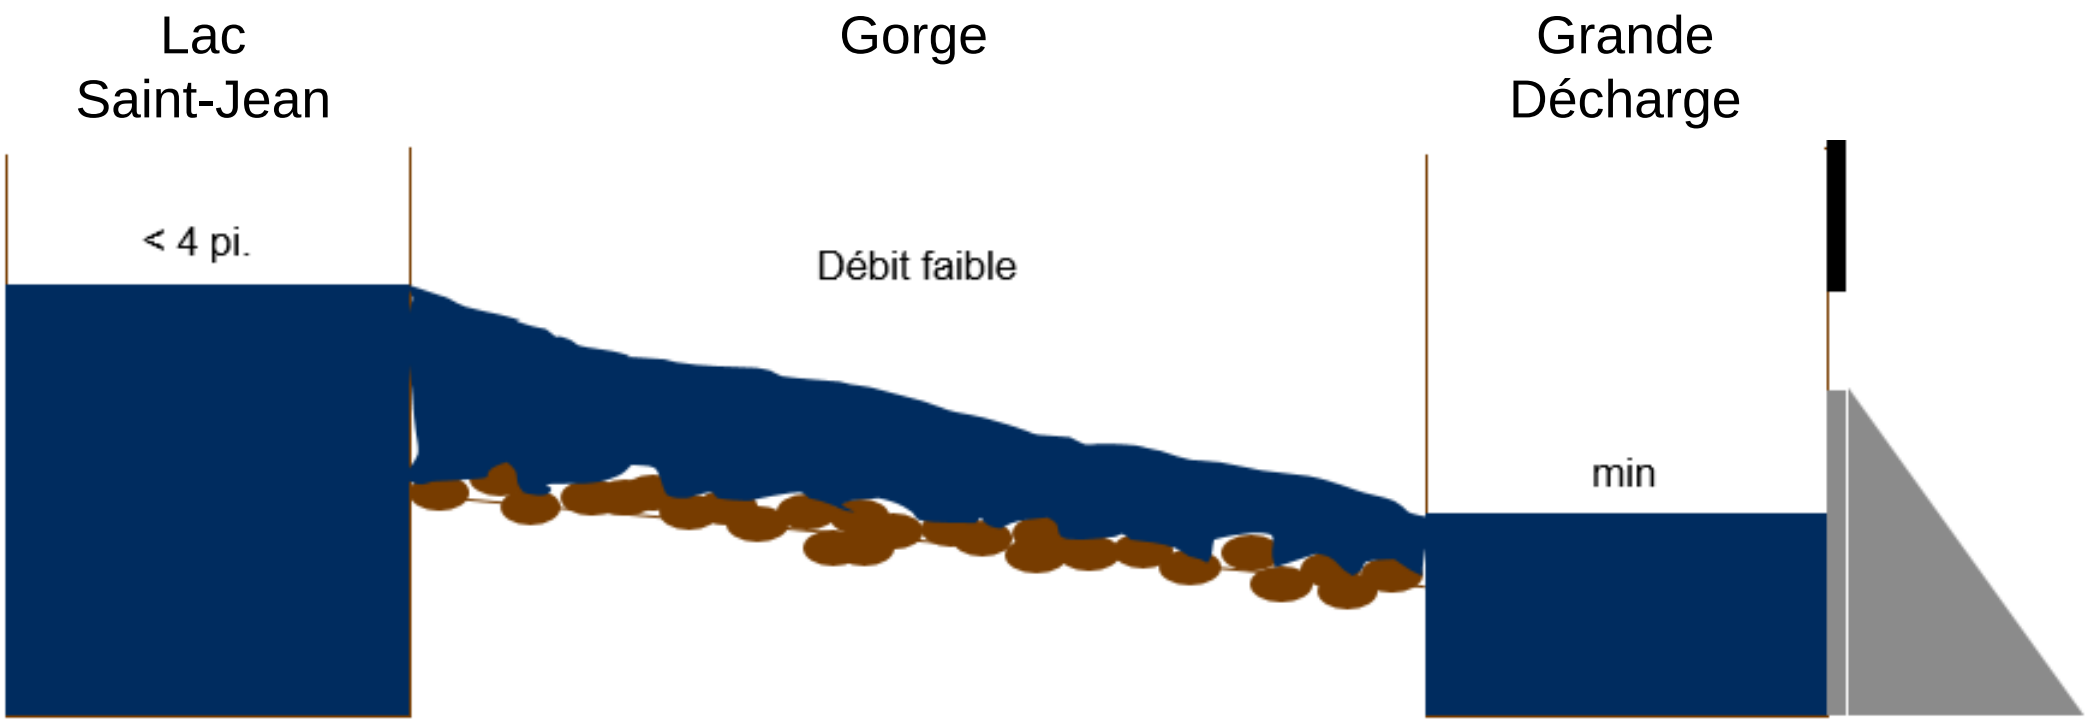

Un niveau minimal du LSJ nécessaire pour déverser à grand débit

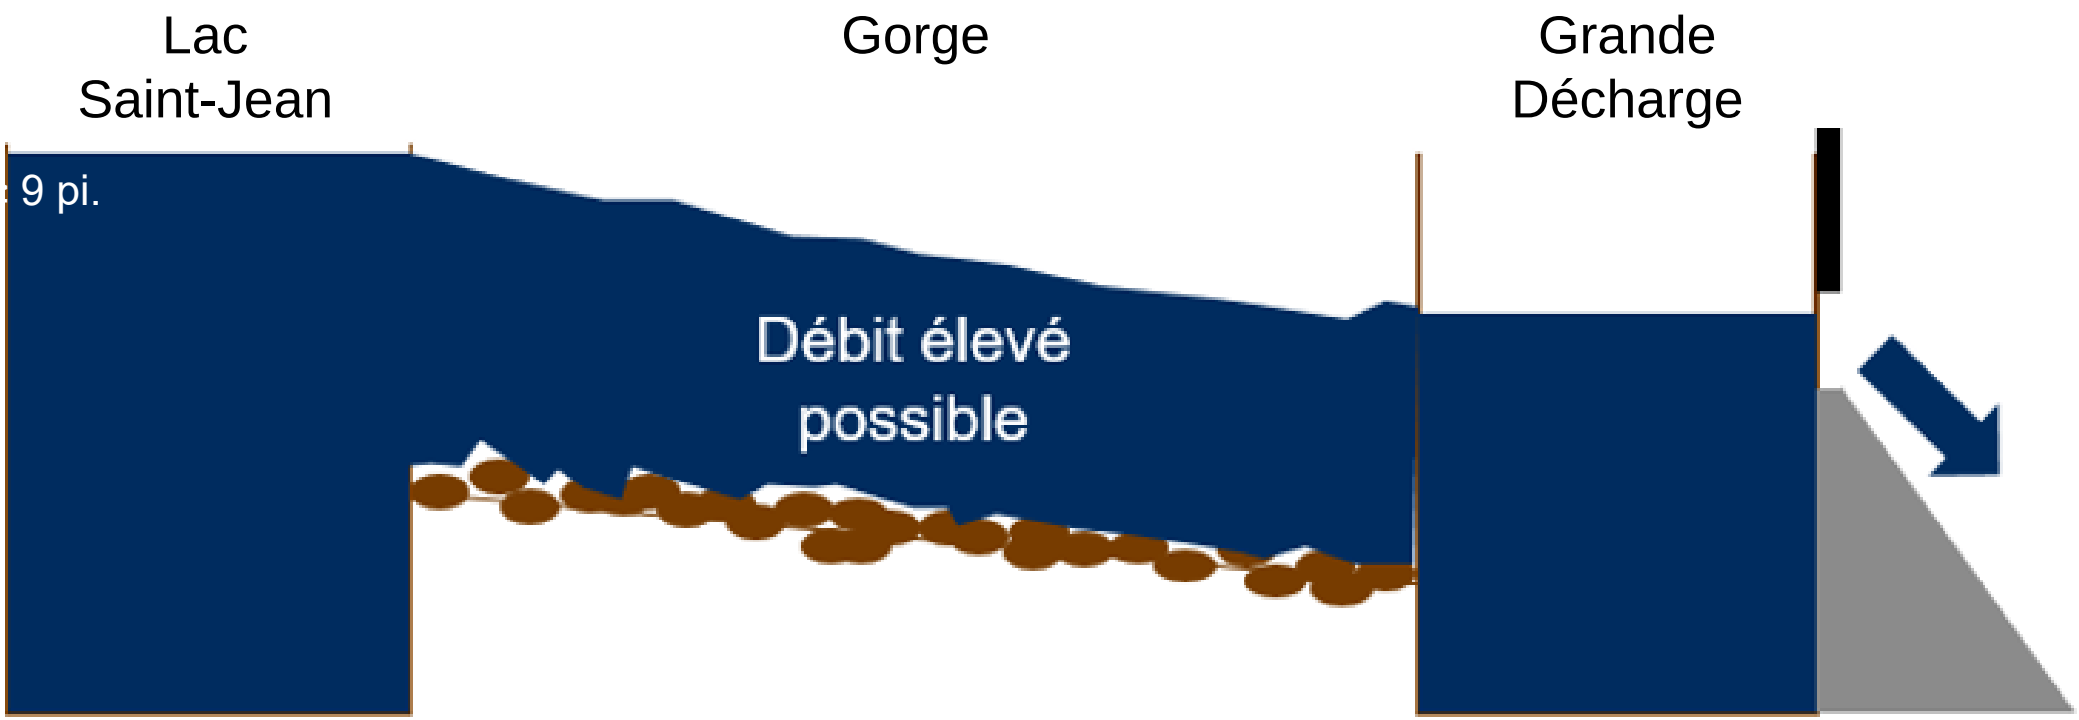

En résumé…

- Dépassement de 16,5 pi. : il y a toujours un risque selon la météo! **Mais le niveau actuel plus haut que la normale n'a pas d'impact sur ce risque**
- Situation sous contrôle : probabilités du respect des limites d'opération à 90 % (au 23 mars)
- Un niveau minimal du LSJ est nécessaire pour déverser à grand débit et soutenir la production
- Analyse et ajustements 7 jours sur 7
- Ouverture des déversoirs en fonction de l'évolution des conditions météos
- Ouverture partielle, déglaçage et préparation en cours

Échanges et questions

Survol du bilan annuel 2021

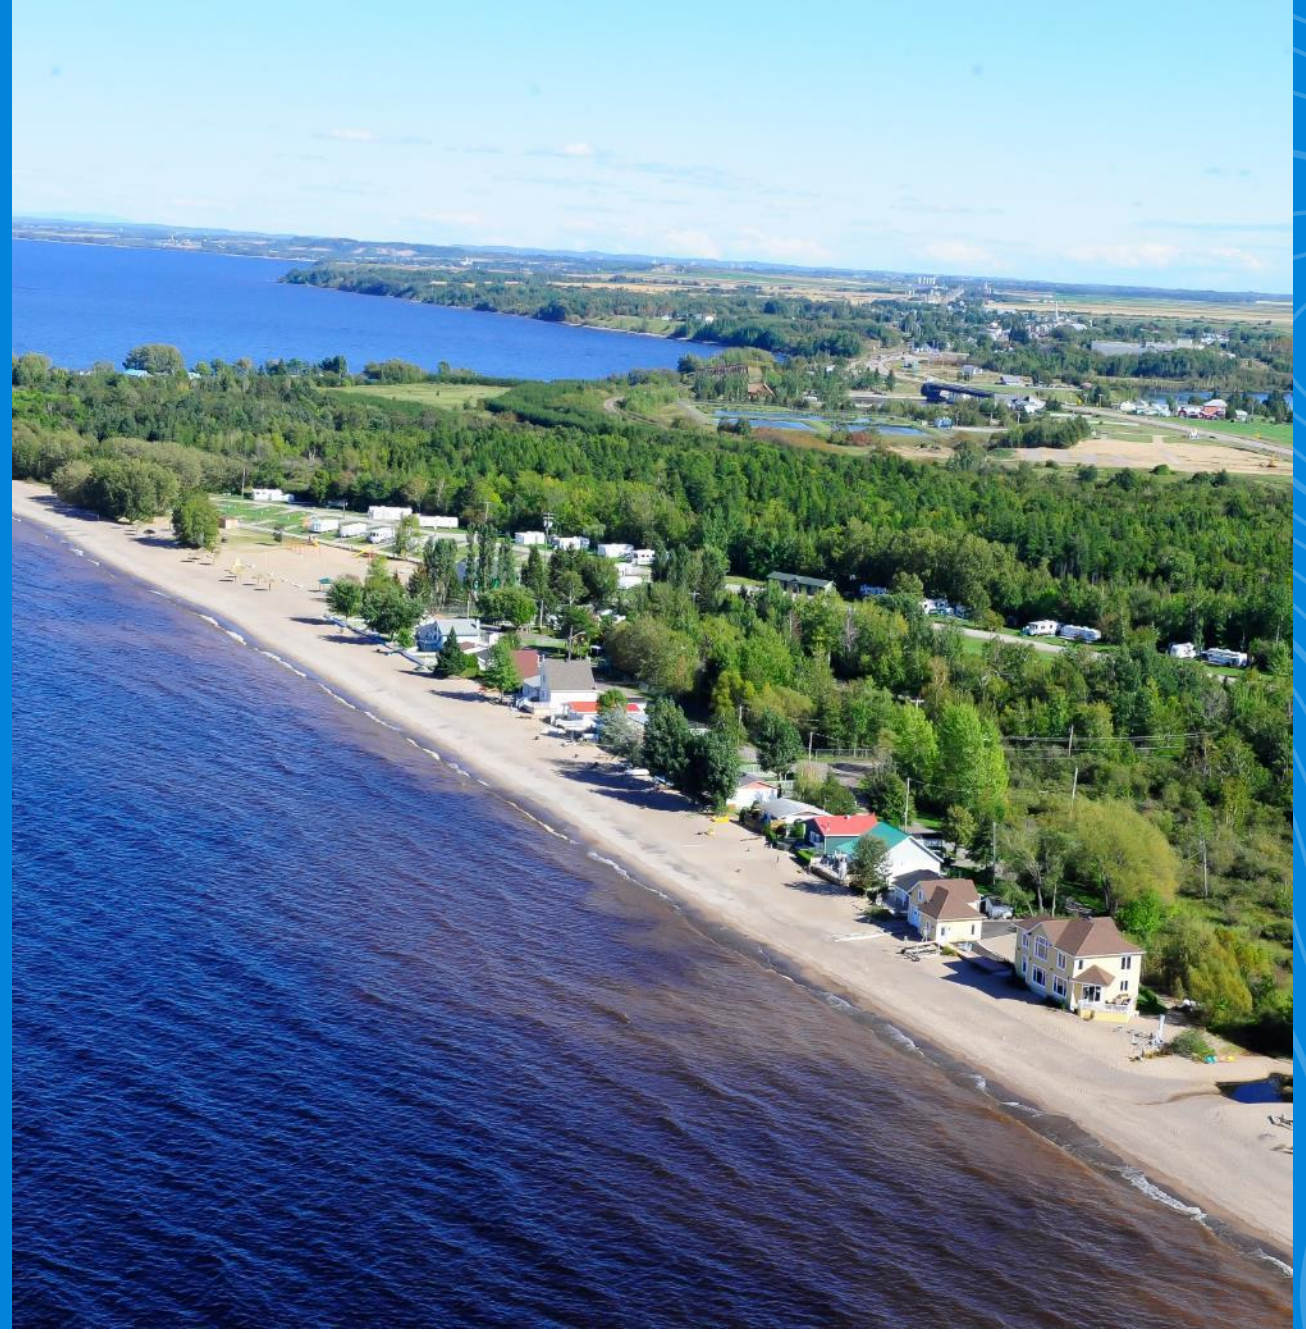

Fiche bilan 2021

RioTinto

Bilan 2021 du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean

Une année particulière sur le plan de la gestion hydrique

La gestion hydrique est une science qui se base sur les caprices de Dame Nature, tantôt généreuse, tantôt avare. L'année 2021 aura été particulière à bien des égards du point de vue météo. La crue hâtive a été plutôt timide et a été suivie par un été et un automne dont les apports ont été les 5e plus faibles depuis 1953. Résultat : le niveau du lac Saint-Jean a connu un niveau maximum de 15,4 pieds au début juin, et a entamé une lente descente tout au long de l'été, pour atteindre des niveaux inhabituels. Tout au long de cette période, Rio Tinto a continué à respecter les paramètres gouvernementaux autorisés en matière de gestion hydrique. Il faut dire que la séquence de 62 jours consécutifs où les apports étaient de moins de 815 m³/s constituait du jamais-vu. Au total, 94 jours ont été sous la marque des 815 m³/s entre le 6 juin et le 22 septembre. Comme quoi, Dame Nature n'a jamais dit son dernier mot !

Si l'eau n'était pas au rendez-vous, le nombre de tempêtes et les conditions érosives ont aussi été à la baisse en 2021. Il s'agit de la huitième année avec des conditions érosives sous la normale. Cela s'est d'ailleurs reflété sur la programmation des travaux puisque trois sites seulement – tous à Chambord – faisaient partie de la programmation 2021.

Le Programme de stabilisation des berges a poursuivi sa mission axée sur le développement durable, c'est-à-dire de contrer l'érosion en tenant compte des aspects sociaux, environnementaux, économiques et techniques. En tout, 14 suivis techniques, environnementaux, sociaux et archéologiques ont été réalisés afin de s'assurer que l'objectif global du Programme soit atteint. Toutes les activités et les interventions du Programme de stabilisation ont été réalisées en conformité avec le décret 2018-2027.

L'investissement global lié aux activités pour l'année 2021 s'élève à

1,6 M$

[Disponible sur notre site Internet]

2021: autre année de faibles conditions érosives

- Année 2021: 3 sites de travaux à Chambord
- Une 8e année consécutive de faibles conditions érosives
- Seulement 38 requêtes reçues par la communauté
- Poursuite de la collaboration avec le Conseil de gestion durable et les intervenants du milieu

Gestion participative

111
rencontres au total

29
Conseil de Gestion durable et ses comités

39
porte-à-porte

Les rencontres virtuelles ont permis de multiples échanges de qualité avec les différents intervenants

30
représentants d'associations riveraines à la rencontre annuelle

9
municipalités
+ 3 MRC
rencontrées

2021: bilan des conditions érosives

– Nombre de tempêtes et des conditions érosives inférieures à la moyenne pour une 8e **année consécutive**

– Vents dominants:
  – ouest-nord-ouest (ONO)
  – est-sud-est (ESE)

15 TEMPÊTES
(21 en moyenne)

188 HEURES de tempêtes
73% de la moyenne
(258 h en moyenne
entre 1993-2019)

236 JOURS libres de glace
(216 jours en moyenne
entre 1993-2019)

Travaux en 2021

- En 2021
  - Plus de 550 mètres de berge a été protégé de l'érosion
  - Représente 0,1% des secteurs suivis par le PSBLSJ

3 SITES DE TRAVAUX
(tous à Chambord)

1,6M$ INVESTIS

14 ÉTUDES
techniques, sociales, environnementales et archéologiques

Travaux en 2021

- 1 site de rechargement de plage et prolongement d'un épi
- 1 site de repositionnement de pierres dans le perré existant
- 1 sécurisation de rampes de mise à l'eau

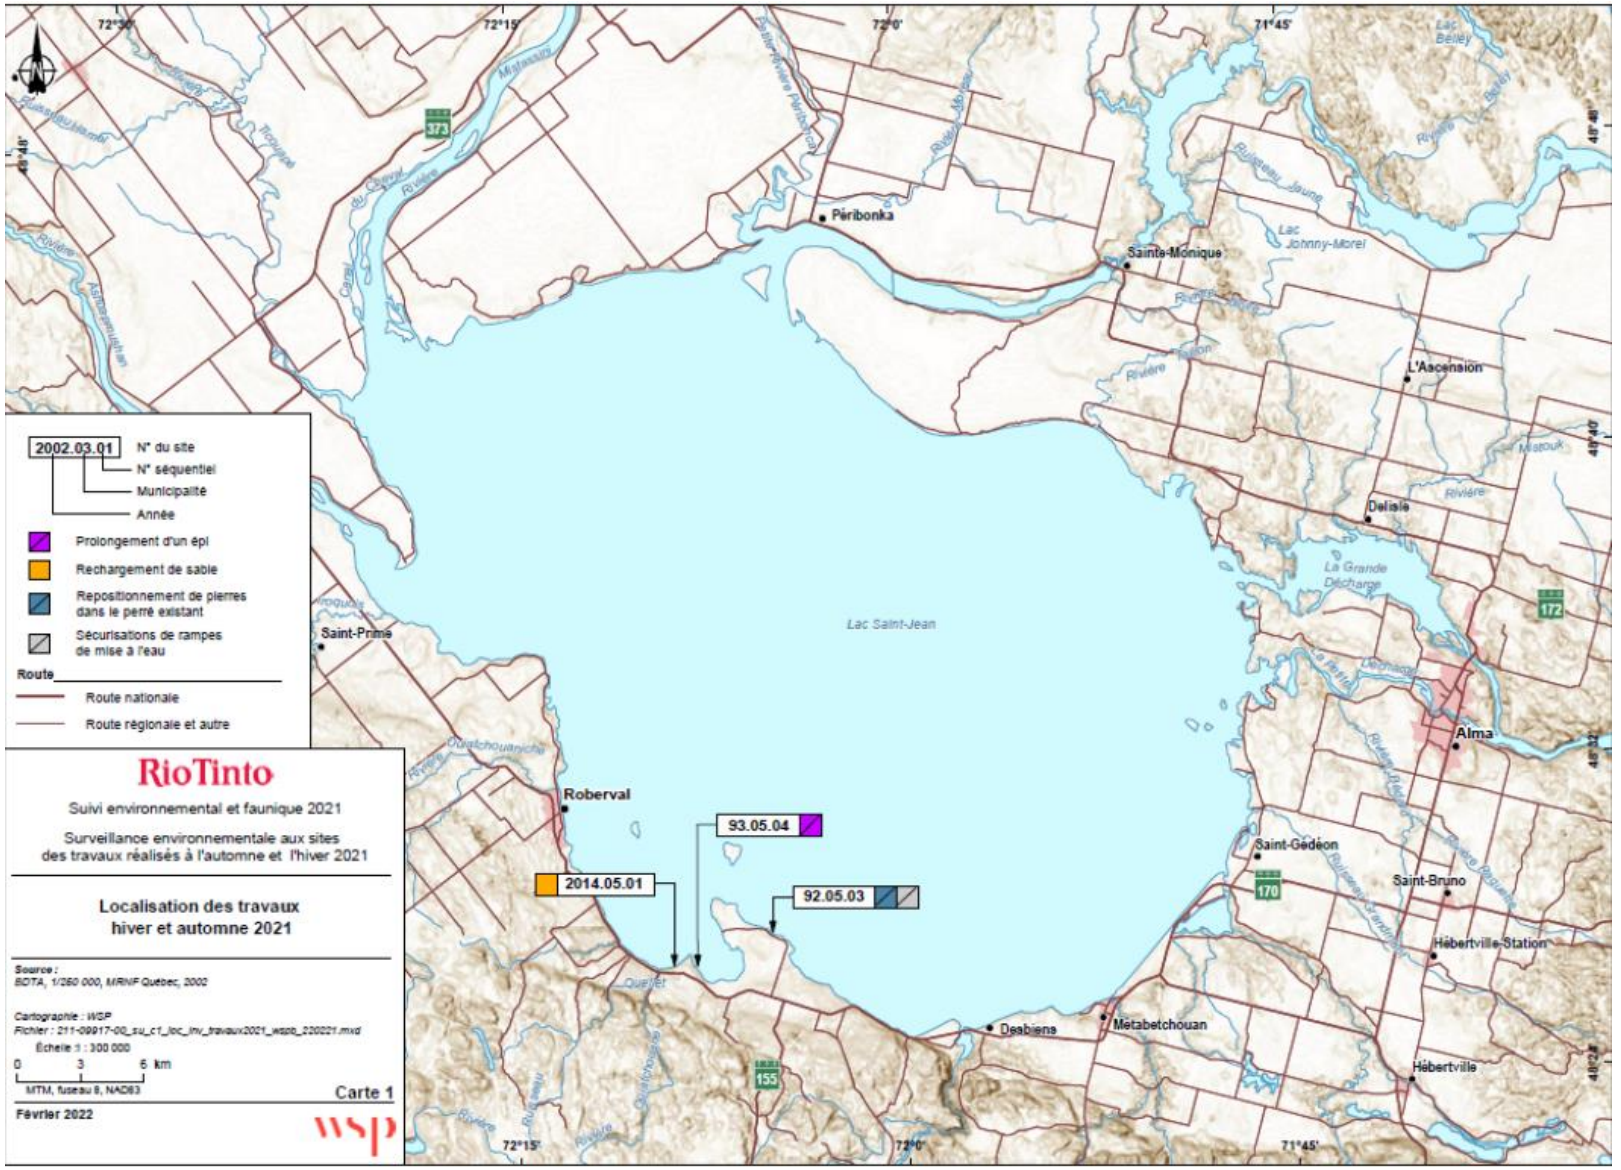

Échanges et questions

Secteurs sous surveillance 2022

Arpentage annuel des 50 km de plages en 2021

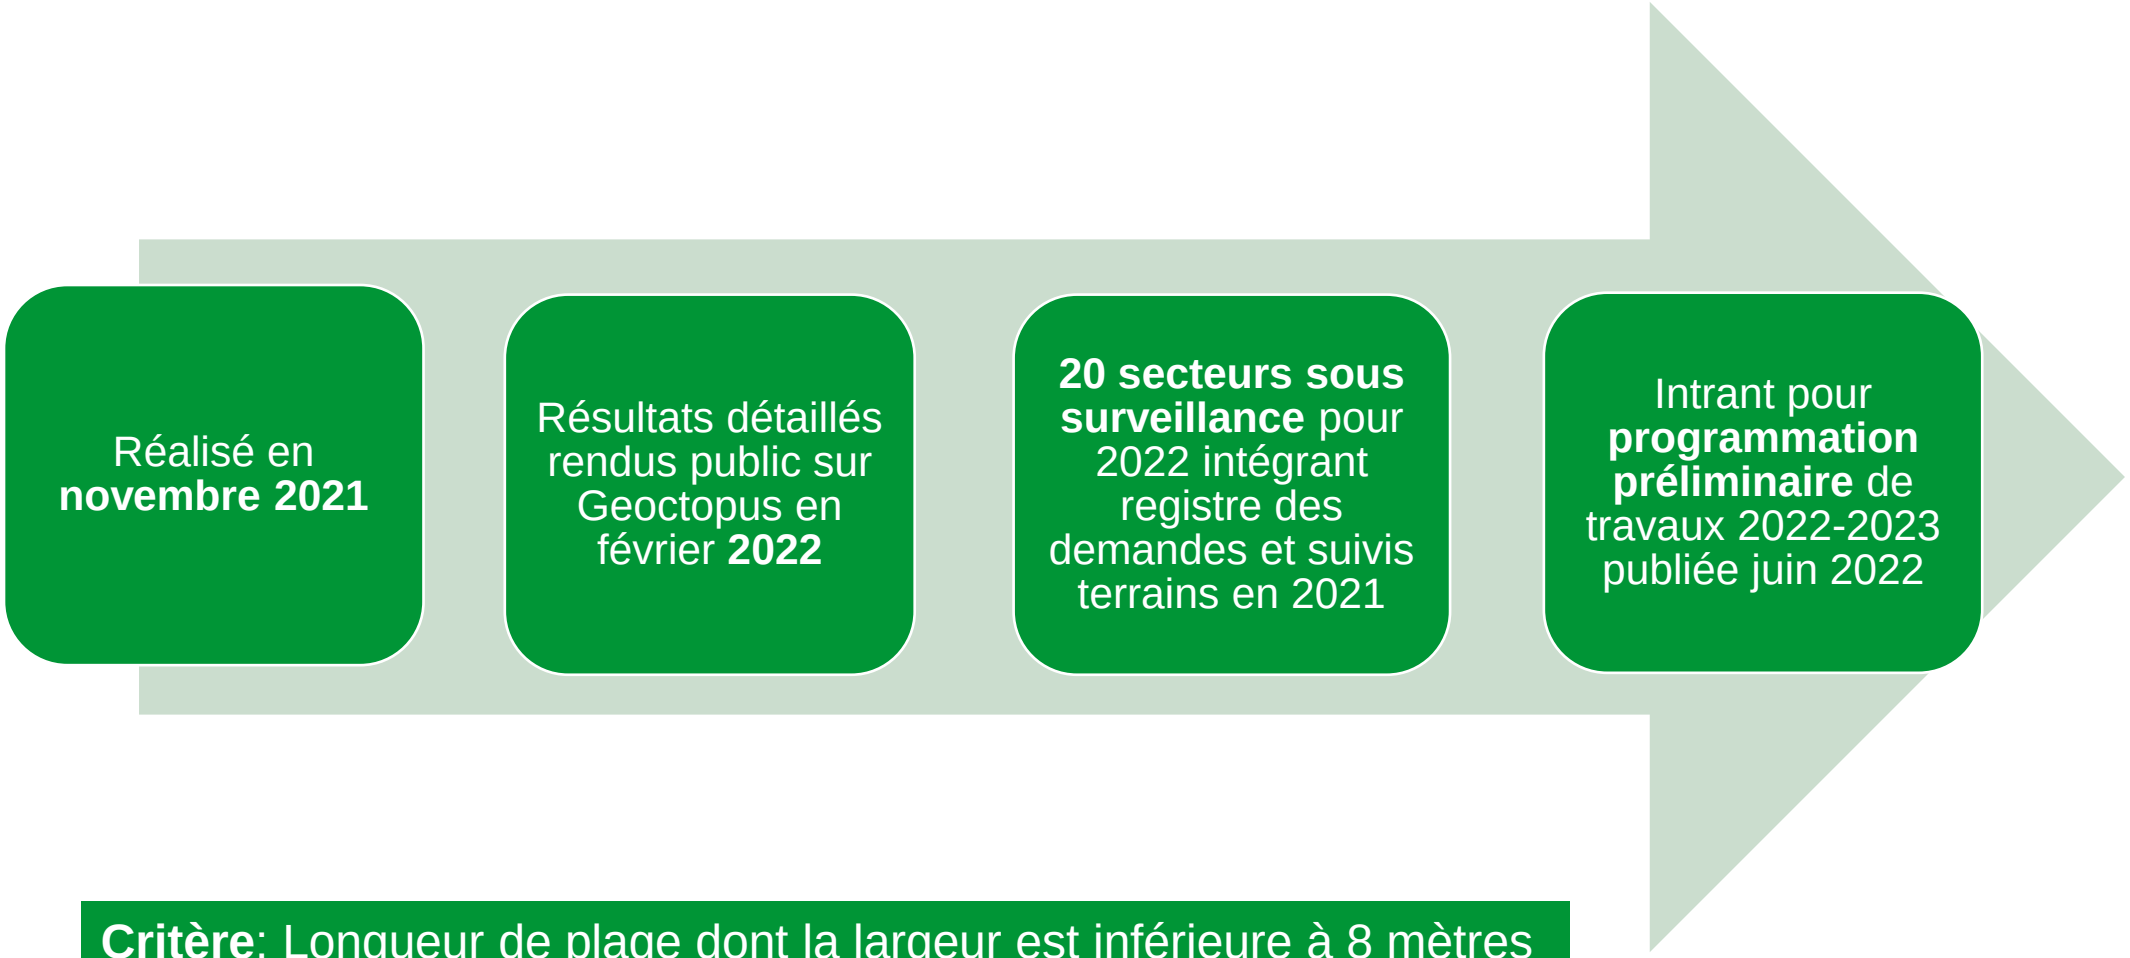

Critère: Longueur de plage dont la largeur est inférieure à 8 mètres sur 30% de leur longueur ou 100 mètres

Résultats d’arpentage

- De 1986 à 2021 : accroissement moyen des largeurs de plages de 82%, soit 11,3 m sur 45 km
  - 5 kilomètres de plage suivis ont été ajoutés en 2018
  - Largeur moyenne 2021 : 27,6 m (- 0,3 m par rapport 2020)

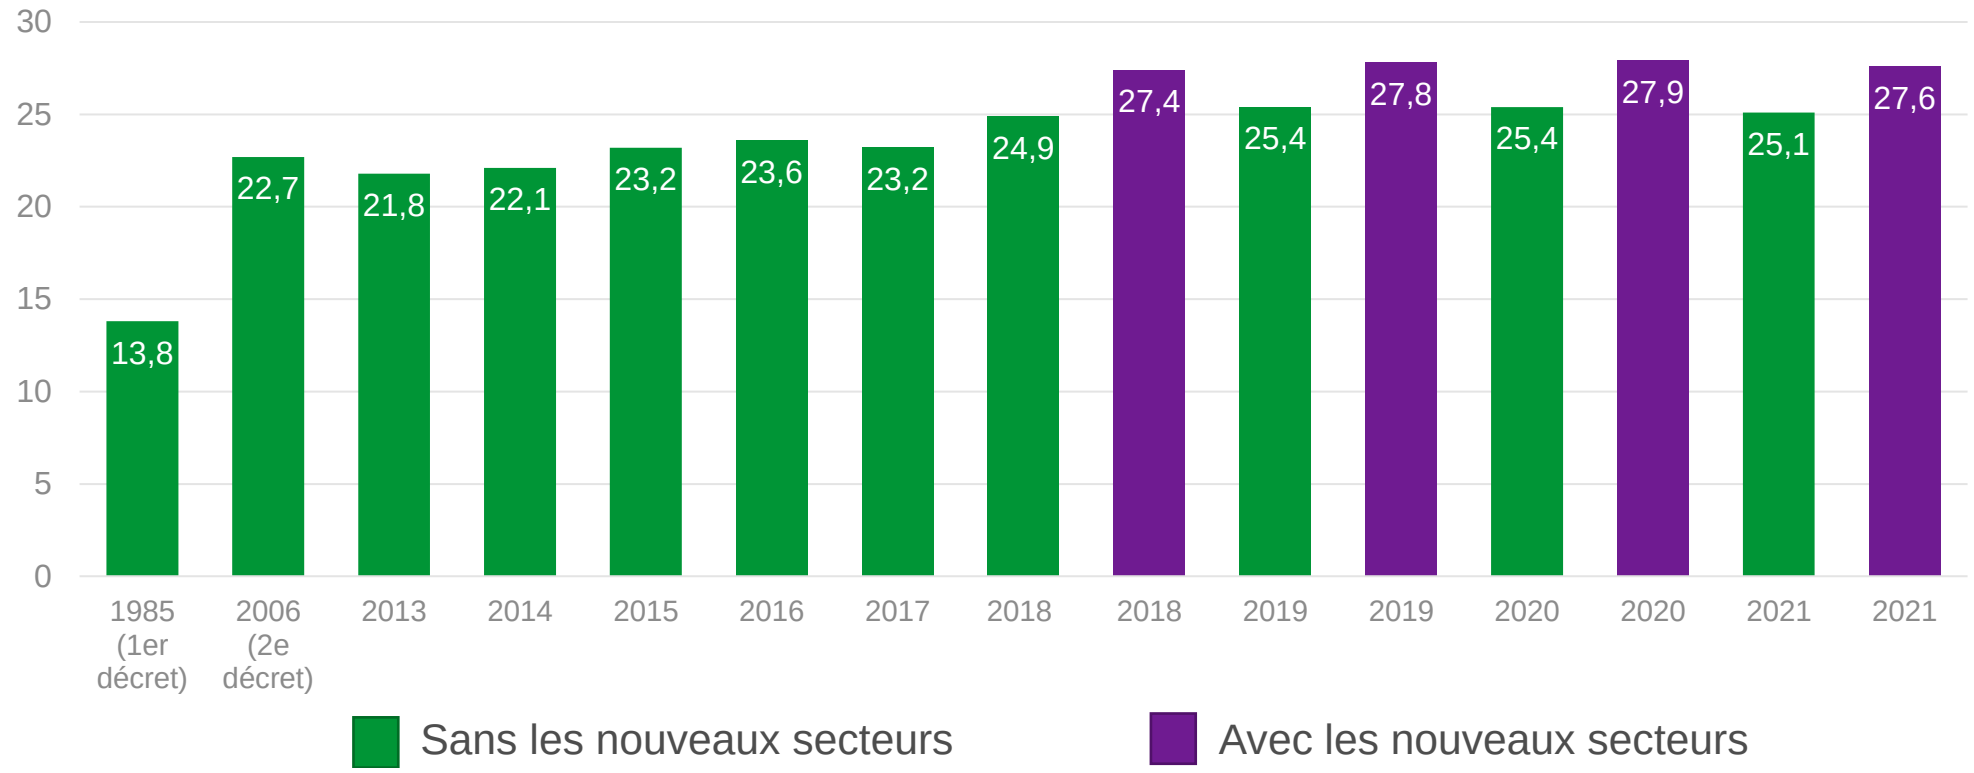

20 secteurs d’érosion sous surveillance - mars 2022

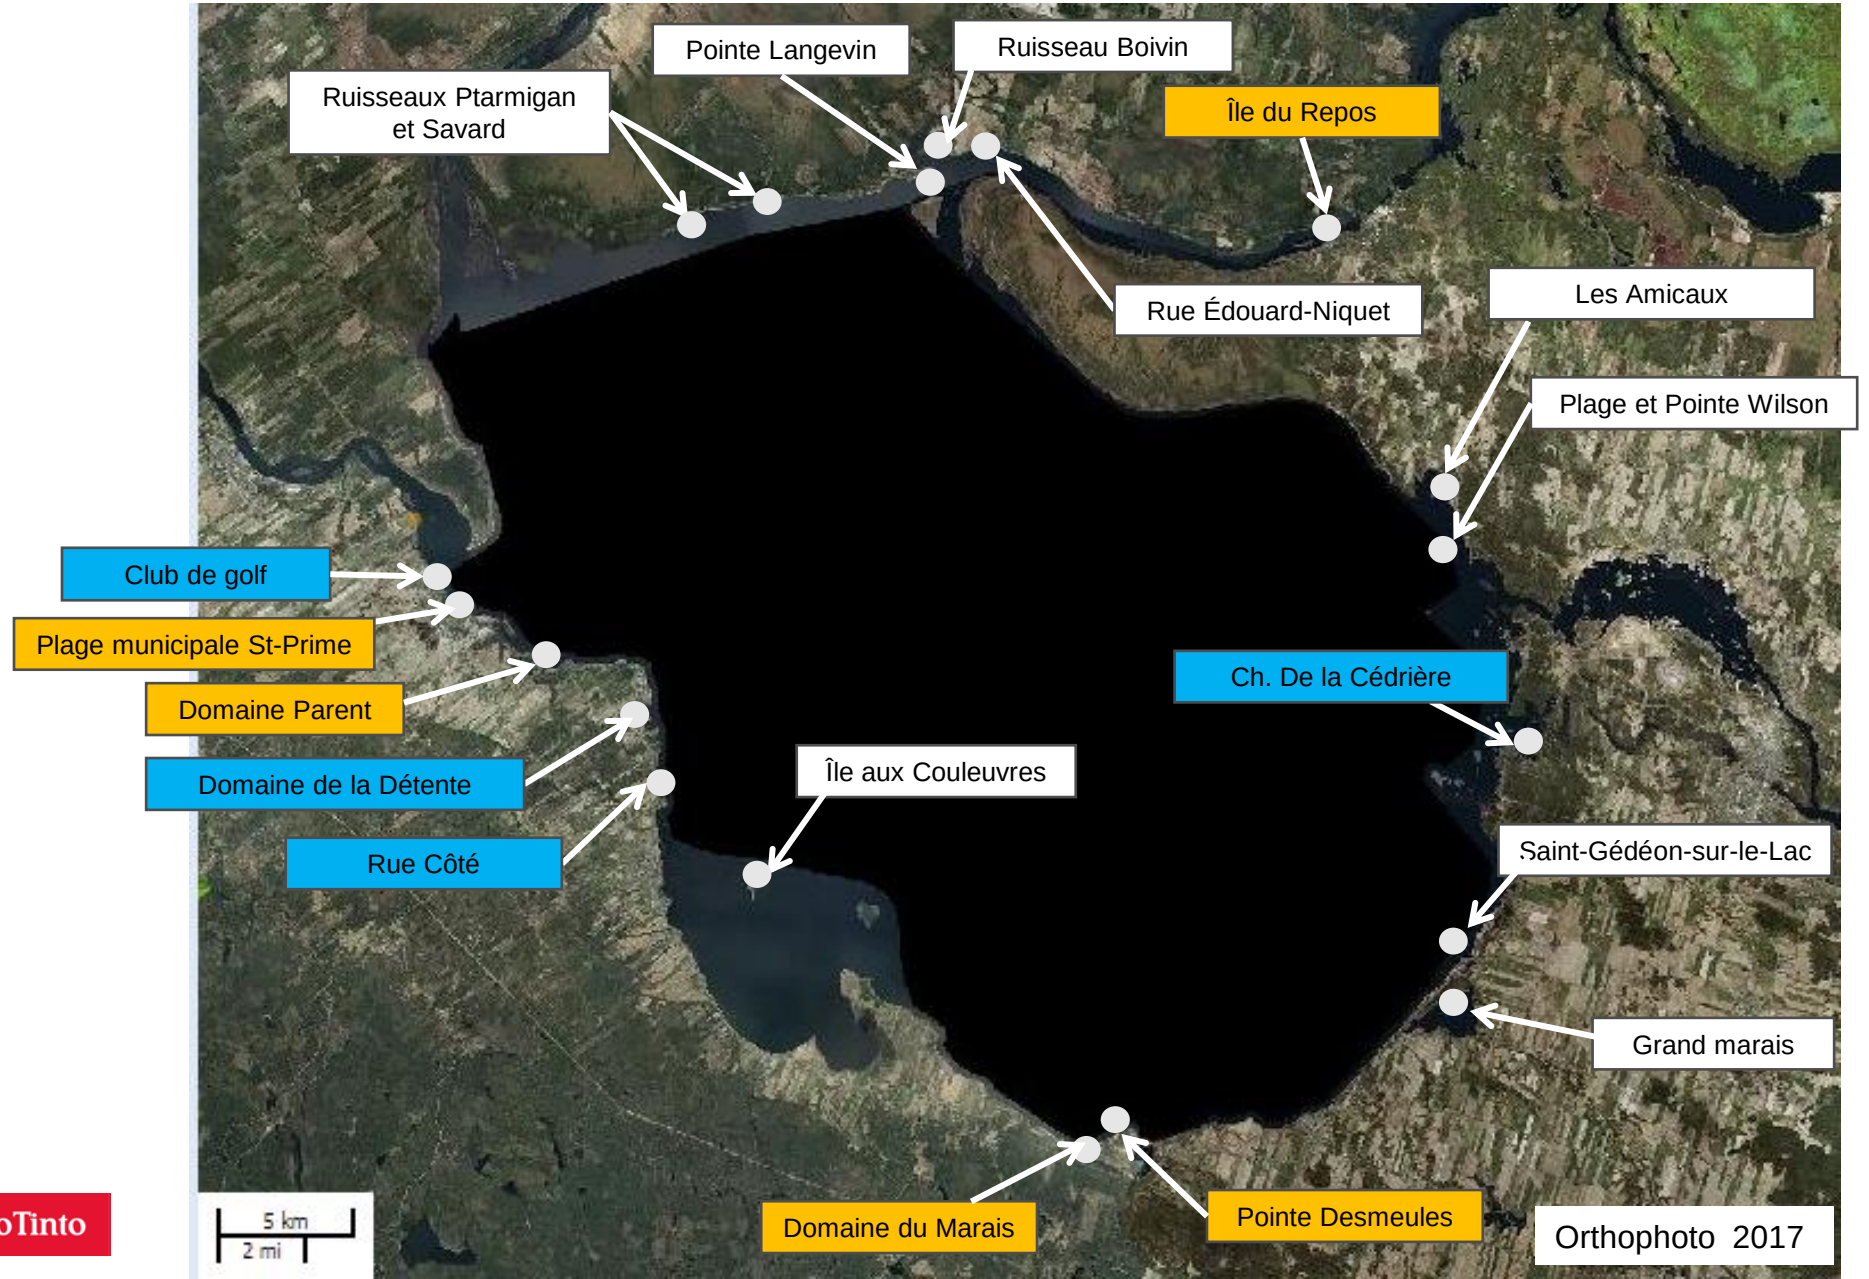

Intrants

1. Arpentage A2021
2. Demandes des usagers
3. Visites terrains en continu

Plus de 100 m de plage ou 30% inférieurs à 8 m de large (5)

Sites qui font l’objet de demandes de riverains (4)

Sites qui font l’objet de suivis particuliers (11)

- Ces secteurs représentent des zones sensibles qui pourraient nécessiter des travaux dans la prochaine programmation.
- En règle générale, ces secteurs nécessitent des suivis plutôt que des interventions à court terme

Échanges et questions

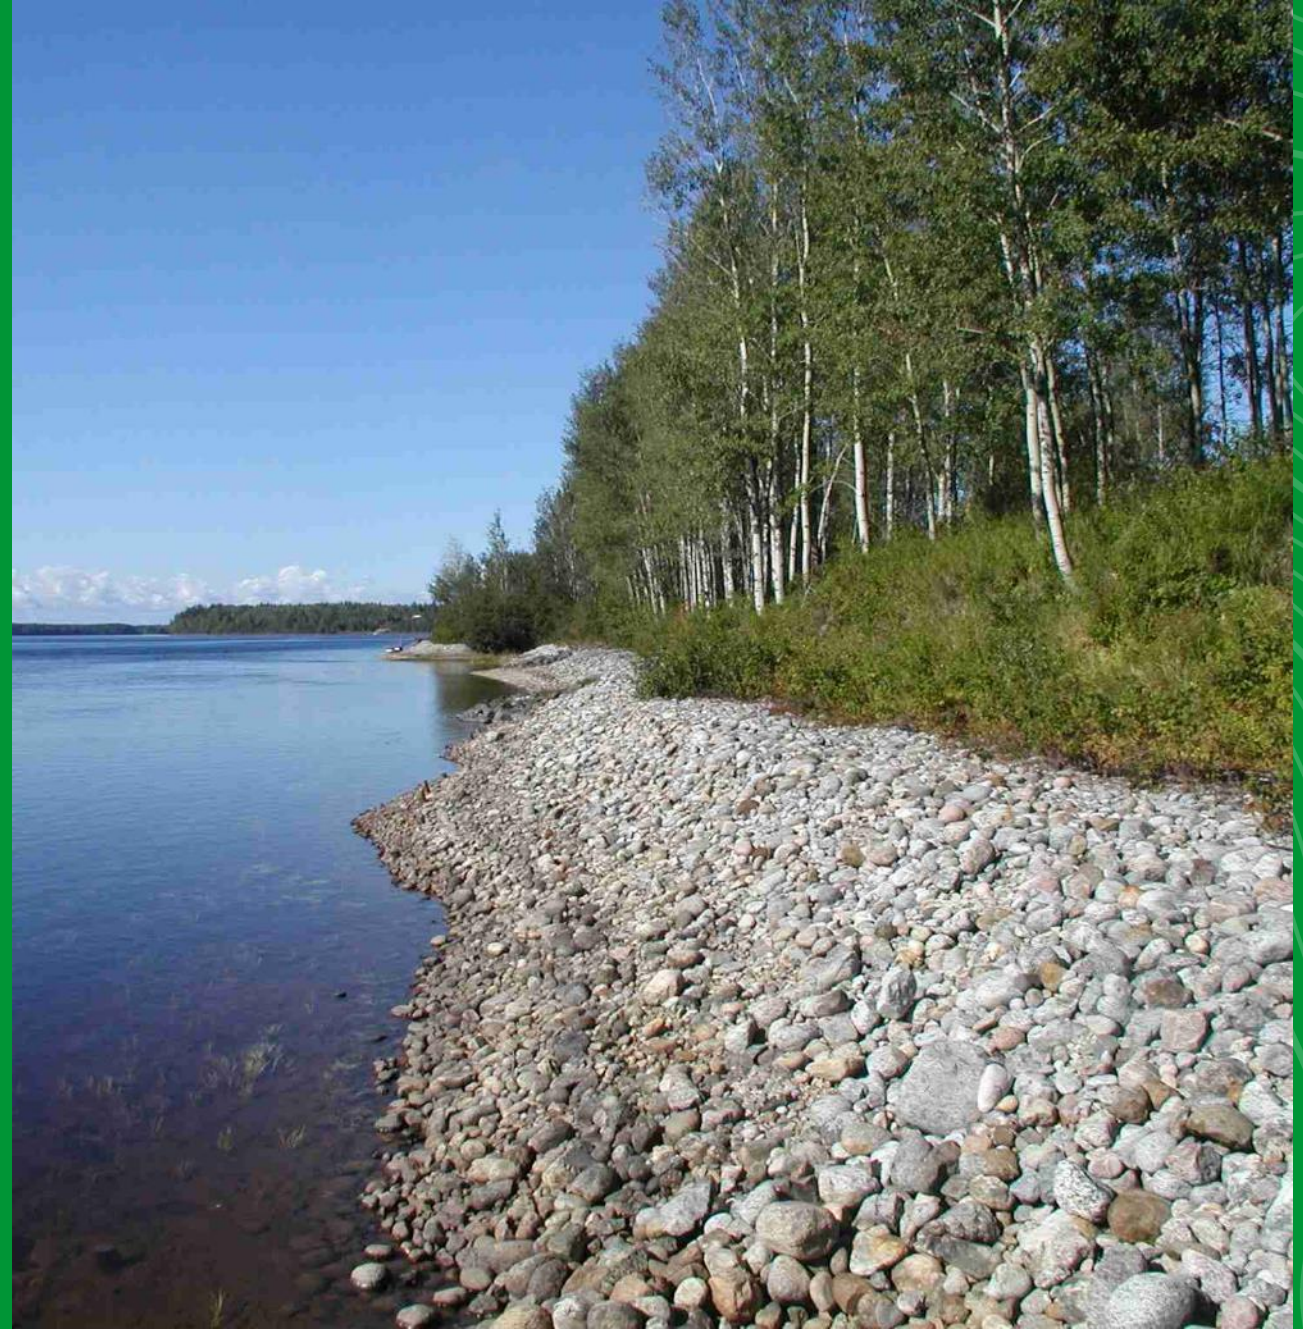

Mise à jour des travaux

– 5 sites de travaux
– Automne 2021 et hiver 2022

Programmation définitive 2021-2022 – 5 sites

Détails travaux:

1. Rosario Martel
2. Chemin Bouchard: 10 décembre 2021
3. Dolbeau-Mistassini et Camping St-Pierre: hiver 2022

Intrants

1. Arpentage A2020
2. Demandes des usagers
3. Visites terrains en continu

Plus de 100 m de plage ou 30% inférieurs à 8 m de large (2)

Plus de 100 m de plage ou 30% inférieurs à 8 m de large et qui font l'objet de demande de riverains (2)

Sites qui font l'objet de demandes des usagers (1)

Visite et suivi terrain (2)

RioTinto

Rechargements de plage

Automne 2021 et hiver 2022

Site 94.03.01 – Centre Plein Air Saint-Pierre Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Faits saillants:

- Travaux réalisés en février 2022
- Nivellement des matériaux dans les prochaines semaines et remise en état avant le 24 juin 2022.
- **Retrait d'une espèce exotique envahissante lors du nivellement des matériaux**
- **Plans définitifs disponibles sur notre site internet**

Orthophoto 2017

Site 2014.05.01 – Chemin Bouchard – Chambord

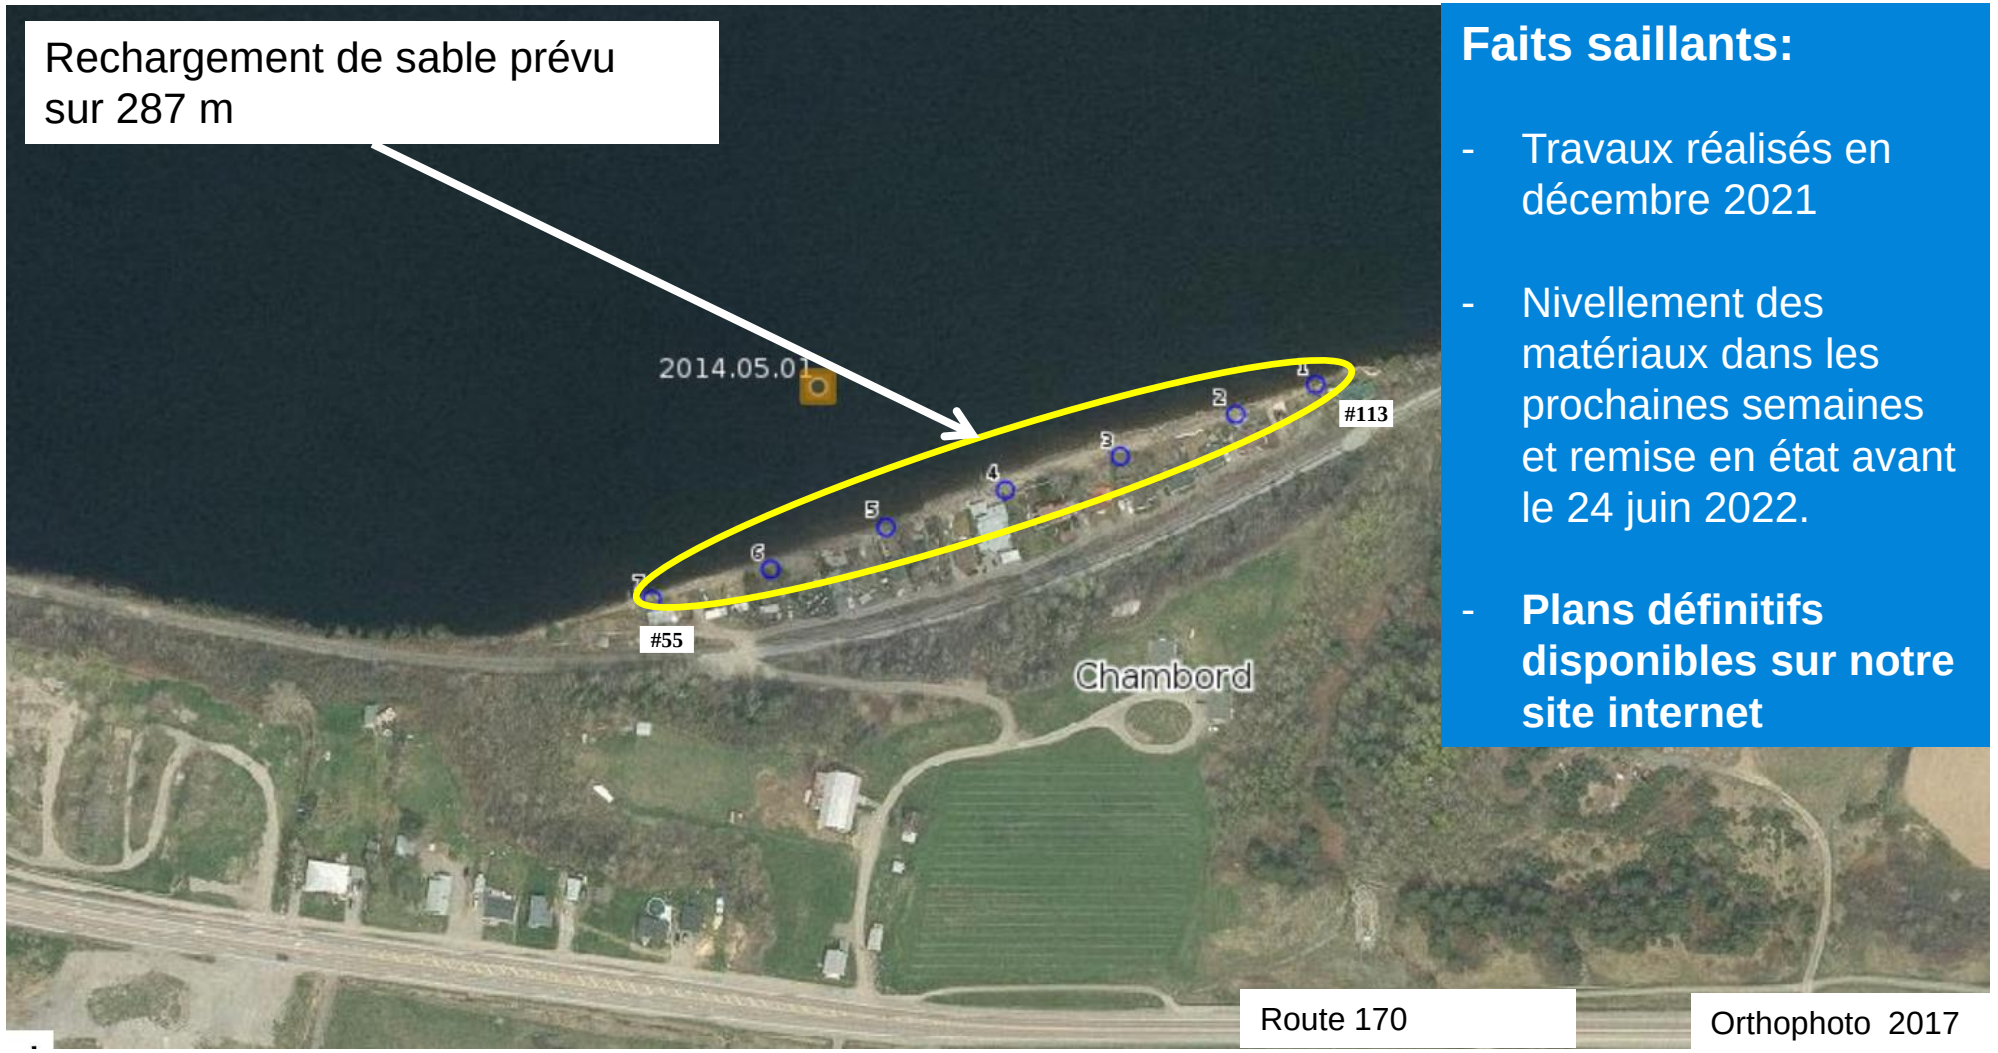

Faits saillants:

- Travaux réalisés en décembre 2021
- Nivellement des matériaux dans les prochaines semaines et remise en état avant le 24 juin 2022.
- **Plans définitifs disponibles sur notre site internet**

Site 95.11.02 – Quartier l'Amicale - Dolbeau-Mistassini

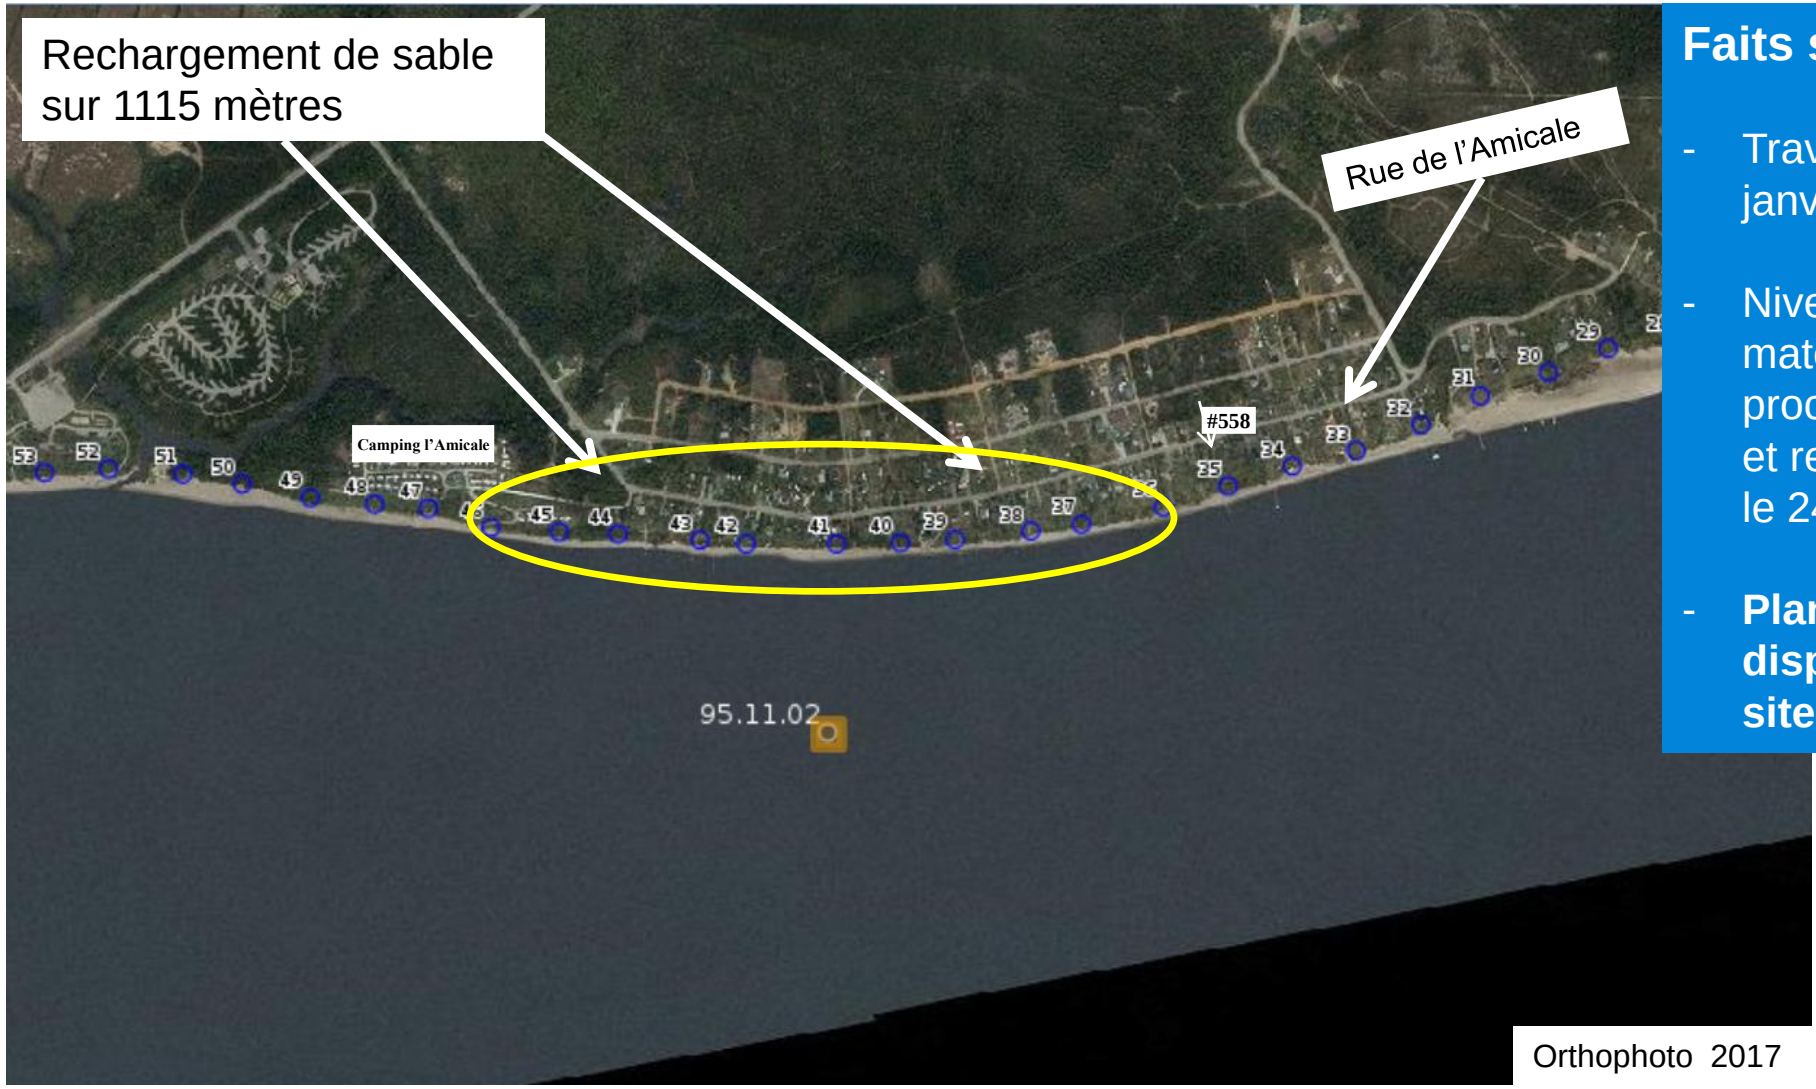

Orthophoto 2017

Faits saillants:

- Travaux réalisés en janvier 2022
- Nivellement des matériaux dans les prochaines semaines et remise en état avant le 24 juin 2022.
- **Plans définitifs disponibles sur notre site internet**

Site 94.11.01 – Racine-sur-le-Lac - Dolbeau-Mistassini

Faits saillants:

- Travaux réalisés en février 2022
- Nivellement des matériaux à finaliser dans les prochaines semaines et remise en état avant le 24 juin 2022.
- **Plans définitifs disponibles sur notre site internet**

Site 95.11.03 – Racine-sur-Mer - Dolbeau-Mistassini

- **Faits saillants:**
- Travaux réalisés en février 2022
- Nivellement des matériaux à finaliser dans les prochaines semaines et remise en état avant le 24 juin 2022.
- **Plans définitifs disponibles sur notre site internet**

Activités à venir

- Nivellement des matériaux de rechargement
- Remise en état des deux sites de travaux avant le 24 juin 2022
- Suivi au marais du Golf de Saint-Prime à compléter (pêches)
- Revue des requêtes
- Travaux d’entretien mineurs – avant la montée des eaux
- Inspections secteurs de plages et berges
- Élaboration de la programmation de travaux automne 2022-hiver 2023 et partage en juin 2022

Échanges et questions

Secteurs de Saint-Gédéon-sur-le-Lac et de la Belle Rivière

- Démarche de consultation
- Présentation des résultats du suivi 2021

Consultation en cours depuis l'automne 2021

Décembre 2021:
1ère rencontre avec **l'ensemble des parties prenantes et le CPP** pour présenter les faits saillants des analyses et répondre aux questions.

Janvier 2022:
Rencontre avec la communauté de **Mashteuiatsh** pour présenter les faits saillants des analyses.

Février 2022:
2e rencontre avec **l'ensemble des parties prenantes**. Retour sur les options de travaux, les commentaires ont été recueillis et les questions répondues.

Février – mars 2022:
1ère et 2e rencontres du comité aviseur

Rencontres avec le MELCC, MFFP et le MPO pour échanger et répondre aux interrogations.

Mars 2022:

Rencontre avec le Maire de Saint-Gédéon et **l'exécutif de l'Association de SGSLL** suite à sa prise de position.

Fin mars 2022:

3e rencontre du comité aviseur: **recommandation d'une variante.**

Prises de position reçues par l'équipe du Programme et considérées pour déterminer l'approche retenue par Rio Tinto, en plus des autres intrants de la consultation.

RioTinto

Démarche globale du projet

- Les travaux de rechargement seuls ne sont plus une option privilégiée: il faut désormais considérer le risque d'obstruction du chenal
- La consultation se poursuit et une intervention est prévue à l'hiver 2023

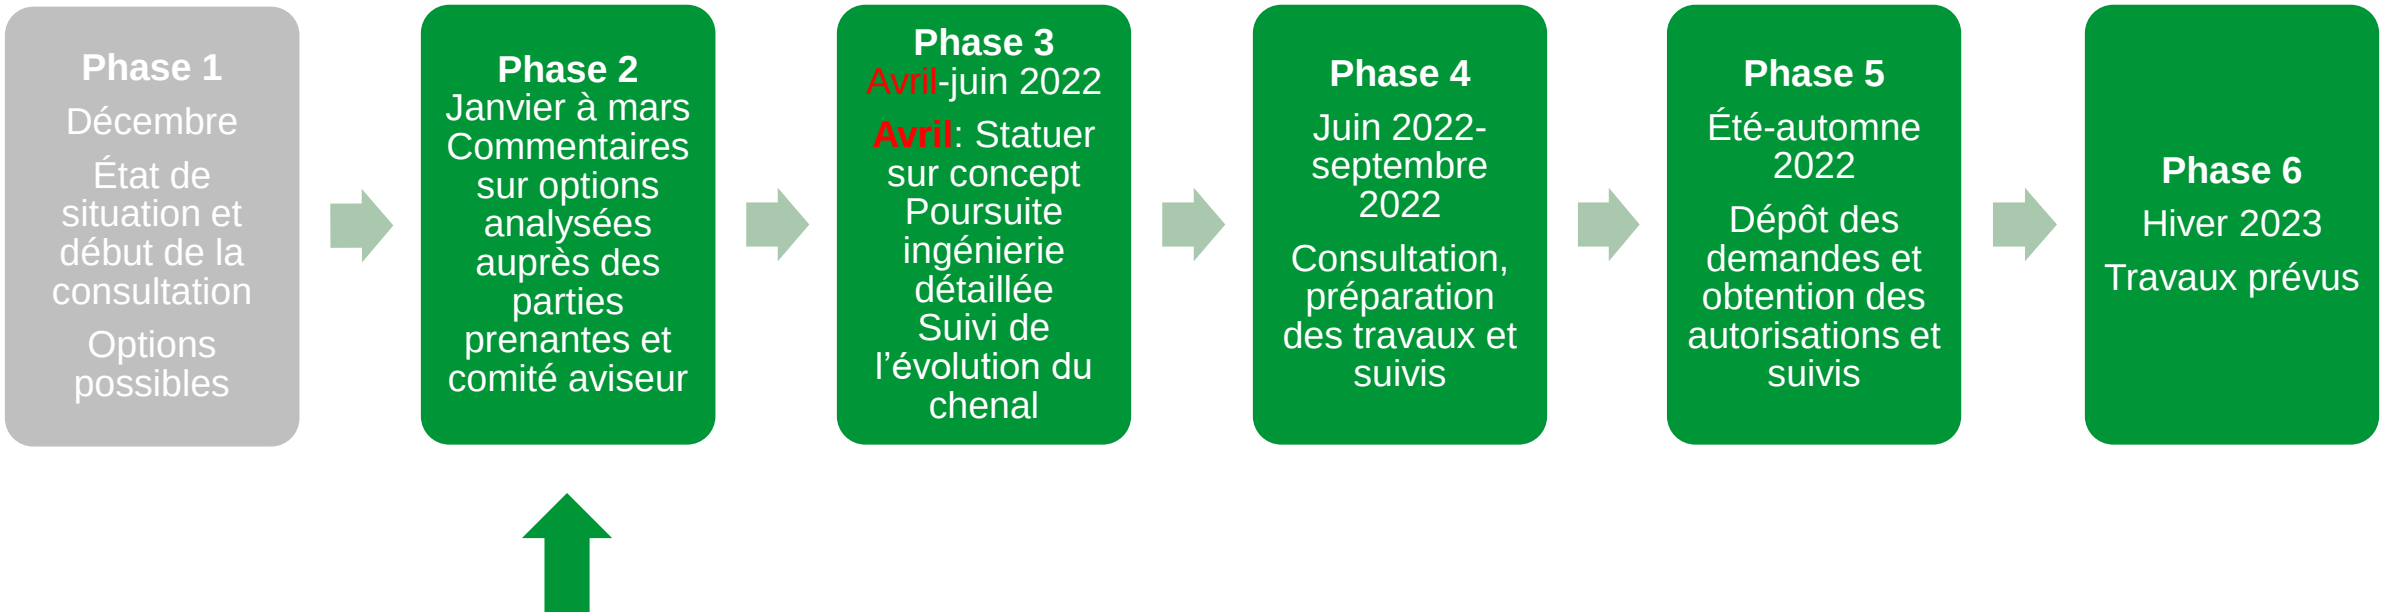

Mandat du comité aviseur

- Comité non décisionnel
- Donner des conseils, formuler des avis ou faire des recommandations sur la situation d'érosion de la plage de Saint-Gédéon-sur-le-Lac en considérant l'ensablement de la Belle Rivière

Rencontres

- Trois rencontres :
  - 9 février
  - 9 mars
  - 30 mars

Composition

	Organisation ou milieu représenté	Représentants
1.	Réseau SÉPAQ	Claude Pelletier
2.	Pekuakamiulnuatsh Takuhikan	David Cleary
3.	MRC Lac-St-Jean-Est	Nathalie Audet
4.	Association des riverains de SGSLL	Marcel Carré
5.	Association des riverains de SGSLL	Bruno Godin
6.	Maire de Saint-Gédéon	Émile Hudon
7.	Conseil de gestion durable du lac St-Jean	Joëlle Guérin
8.	Conseil de gestion durable du lac St-Jean	Pierre Audet
9.	Marina	Yves Gagné
10.	UQAC – Géographie et hydrogéomorphologie	Maxime Boivin
11.	CLAP – Corporation de l'Activité Pêche	Marc Archer
12.	Membre expert	Caroline Jolette et Richard Dallaire, Rio Tinto
13.	Membre expert	Justin McKibbon, WSP
	Facilitateur	Transfert Environnement et Société

Proposition de démarche

Rencontre 1

- Mandat et démarche
- Présentation et éclaircissements
- Atelier sur les critères d'évaluation

Rencontre 2

- Atelier d'évaluation des 5 variantes en fonction des critères d'évaluation
- Recommandation préliminaire

Rencontre 3

- Validation des résultats de l'évaluation
- Mesures d'atténuation supplémentaires
- Formulation de la recommandation finale

Rencontre 1
9 février

Rencontre 2
9 mars

Rencontre 3
30 mars

SGSLL: suivi 2021 des travaux de l'hiver 2019

- **Les résultats 2021 démontrent que les travaux répondent aux attentes** et qu'ils sont en voie d'atteindre leur objectif d'adoucissement de la pente de la plage.
- En 2021, une diminution des taux d'érosion dans la zone critique a été constatée.
- Un rechargement de la plage de Saint-Gédéon-sur-le-Lac est recommandé.
- La **formation de zones d'accumulation** sur le remblai de l'ancien canal s'est poursuivie avec un gain annuel net de près de 30 000 tonnes en 2021**.**
- Ceci devrait permettre de réduire l'énergie des vagues atteignant la berge et **réduire la fréquence des rechargements à long terme.**

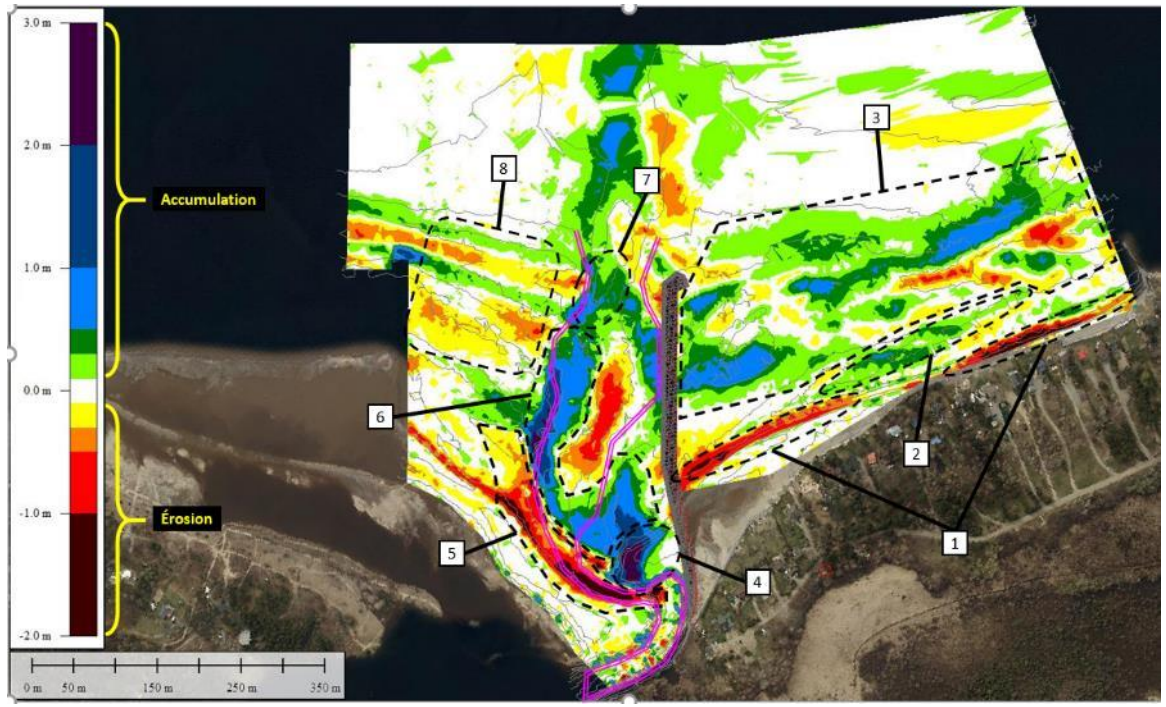

Le suivi technique débuté en 2019 se poursuit dans les prochaines années

Résultats 2021 du suivi des travaux de l'hiver 2019

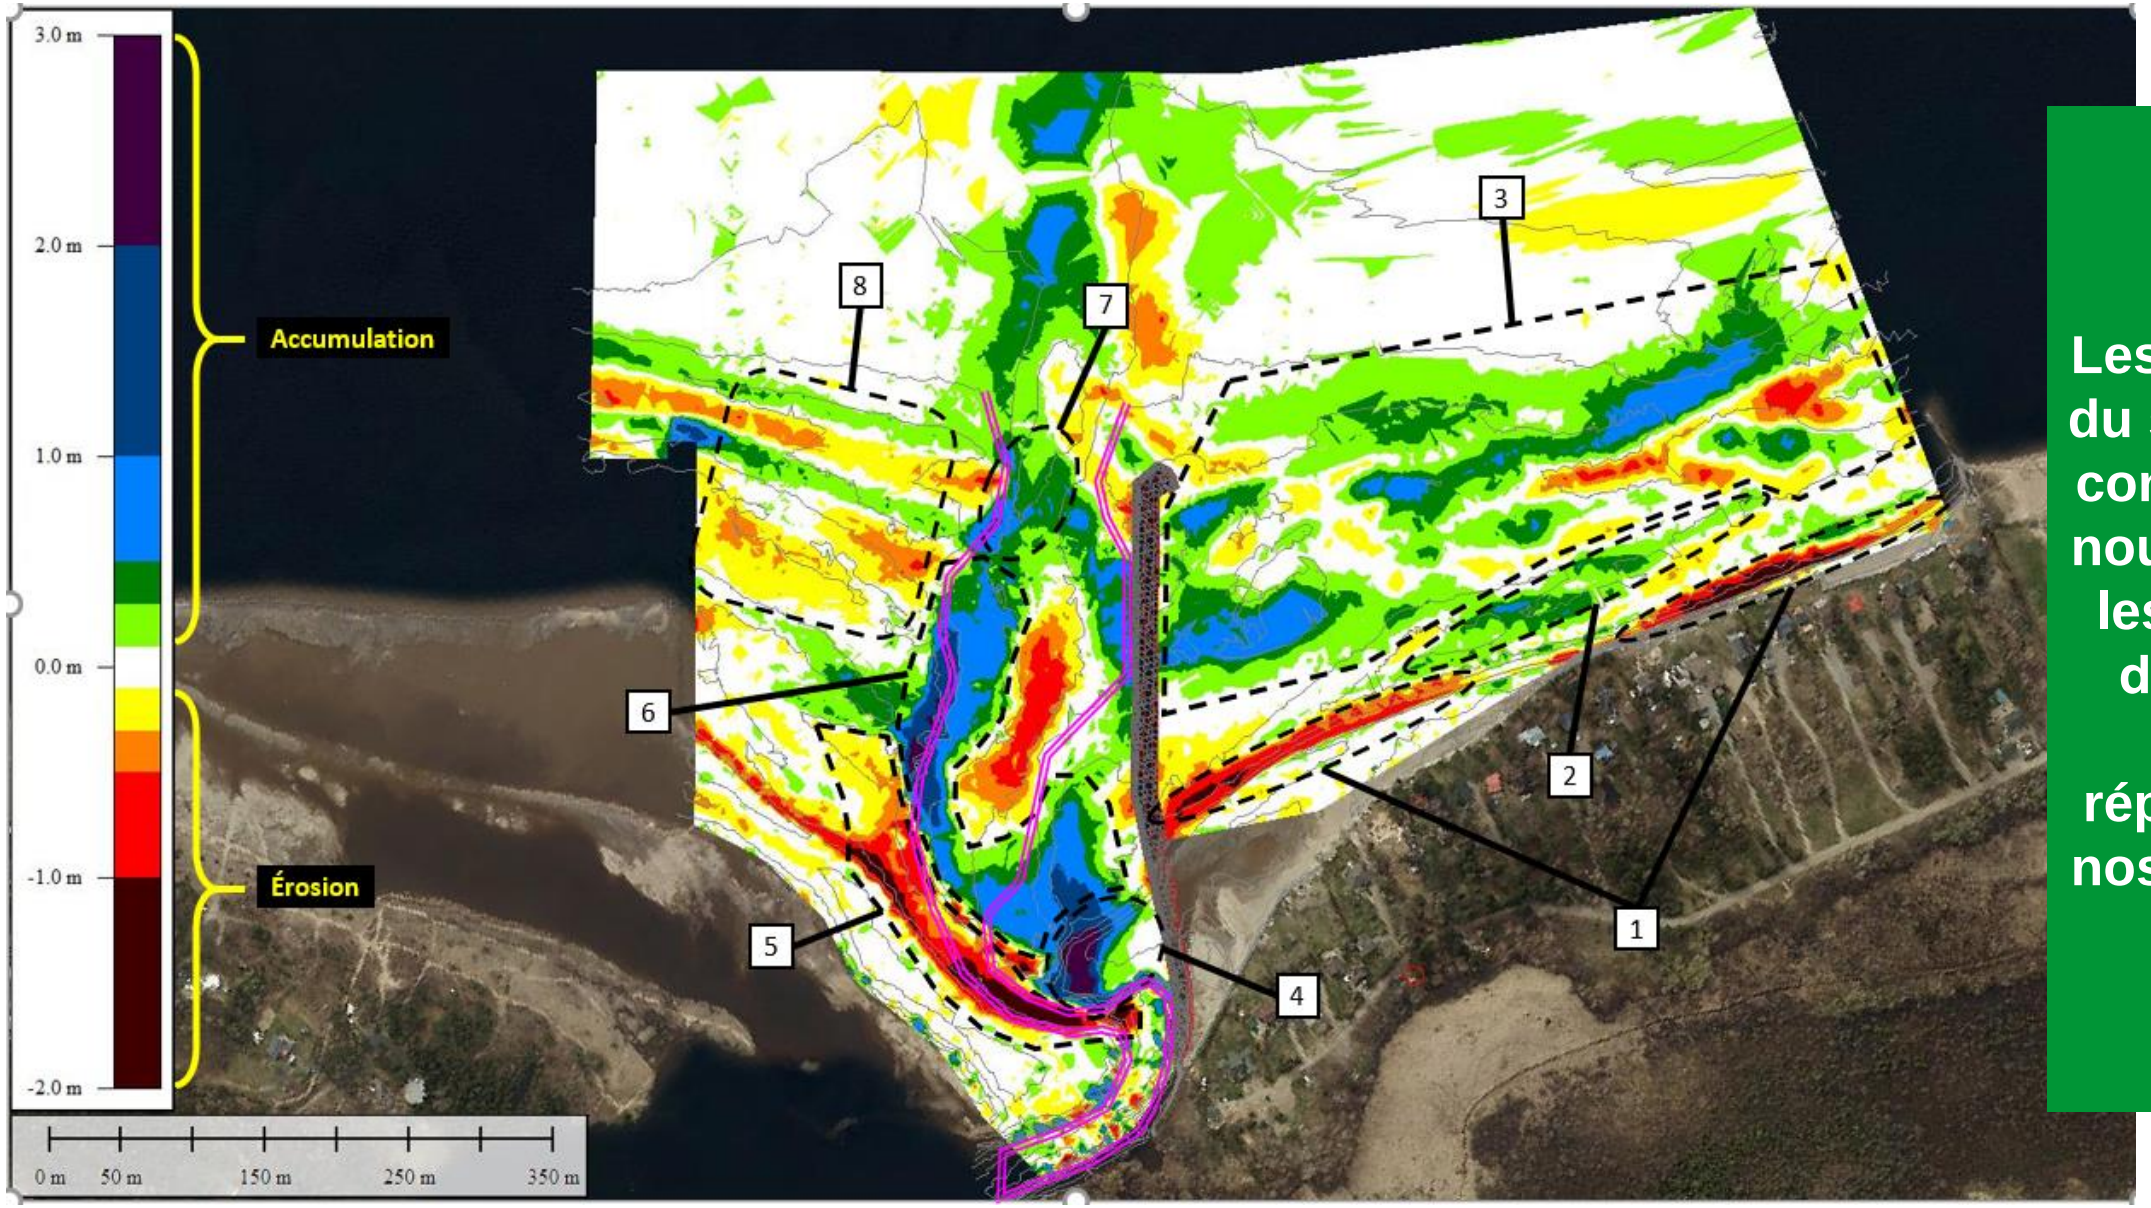

Les résultats du suivi 2021 confirment à nouveau que les travaux de l'hiver 2019 répondent à nos attentes.

Merci de votre contribution et vos échanges!

- **Abonnez-vous à nos infolettres sur energie.riotinto.com**
- Communiquez avec nous en tout temps:
  - 418 668-0151

Comité des parties prenantes
Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean

COMPTE-RENDU

RENCONTRE VIRTUELLE

RÉALISÉ PAR

TRANSFERT
Environnement et Société

24 mars 2022

Table des matières

1 Introduction et suivi 3
2 Gestion hydrique : gestion printanière 3
3 Survol du bilan 2021 4
4 Secteurs sous surveillance 2022 4
5 Mise à jour sur la réalisation des sites de travaux et prochaines étapes 5
6 Retour sur le dossier de Saint-Gédéon-sur-le-Lac et de la Belle-Rivière 5
7 Questions et varia – Prochaines rencontres et sujets d'intérêt 6
8 Fin de la rencontre 6
Actions de suivi 7

Liste des annexes

Annexe 1 : Liste de présences 8
Annexe 2 : Présentation 10

1 INTRODUCTION ET SUIVI

M. Richard Dallaire souhaite la bienvenue à tous les membres du comité et présente l'ordre du jour de la rencontre. Aucune modification n'y est apportée.

Retour sur la rencontre du 9 décembre 2021

M. Dallaire a envoyé les documents du BAPE sur les travaux à la Belle-Rivière quelques heures avant la rencontre. Ces documents sont publics depuis 2017 sur le site du BAPE.

2 GESTION HYDRIQUE : GESTION PRINTANIÈRE

M. Jean Paquin présente un exposé sur la gestion hydrique du lac Saint-Jean et sur l'évolution du niveau du lac. Il détaille notamment les apports en eau dans le bassin versant du lac qui couvre une superficie supérieure à celle de la Suisse.

La présentation complète se trouve à l'annexe 2.

Questions/Commentaires	Réponses
H. Jobin : La gestion hivernale a eu un certain impact dans le secteur de la pointe Wilson. Le couvert de glace est important et certains endroits qui sont habituellement impraticables sont accessibles cette année, notamment l'endroit de la catastrophe des Français. Il a fallu intervenir et des mesures devront être prises avec les municipalités pour garantir la sécurité des gens qui utilisent le lac Saint-Jean l'hiver.	Nous déployons déjà des efforts de sensibilisation et des communications sont faites régulièrement avec les autorités municipales pour les secteurs à proximité de nos installations.
D. Cleary : Est-ce que le fait que le gros des précipitations de neige soit tombé dans le bassin versant de la Péribonka facilite la gestion hydrique puisque cette rivière est « harnachée » par Rio Tinto et Hydro?	Le volume de crue dépend principalement de trois facteurs, soit le couvert de neige au sol, la température et les précipitations reçues au printemps. Le couvert de neige explique environ 60 % du volume de crue. Il est encore trop tôt pour prédire à quoi ressemblera la crue.
L. Ouellet : La montée du niveau du lac, c'est pour compenser ou s'assurer d'avoir assez d'énergie pendant l'arrêt de la centrale Chutes-des-Passes?	Oui en effet. C'est pour s'assurer de répondre à nos besoins en énergie.
L. Ouellet : Peut-on modéliser la crue prévue dans la Belle-Rivière? Est-ce que les apports de neige peuvent garantir un nettoyage des embâcles de sables à son embouchure?	Il n'y pas de modélisation spécifique de la Belle Rivière, mais le couvert de neige observé permet de penser que la crue serait importante et pourrait être comparable aux années 2017-2019. Le bouchon de sable ne dépend pas uniquement de la crue, mais également des apports de sable qui dépendent des vents et du transport des matériaux par les vagues. Le risque d'obstruction demeure pour cette année.

	Il va perdurer tant qu'il n'y aura pas de barrière pour arrêter l'apport en sable selon nous.
L. Ouellet : Peut-on modéliser la crue de la Belle-Rivière à parti des débits communiqués quotidiennement par le ministère?	C'est certainement faisable, l'information pourra vous être communiquée ultérieurement.
H. Jobin : Est-ce que la crue printanière entraine un risque de débordement aux installations de Chutes-des-Passes ?	Non, la faible année hydrique de l'an passé a créé un déficit hydrique, partiellement compensé par les précipitations de cet hiver, et, par conséquent, une fenêtre d'opportunité intéressante pour effectuer les travaux à la centrale.
	R. Dallaire : Nous vous rappelons que les communications de Rio Tinto seront plus régulières durant la crue printanière, comme à l'habitude. Nous vous invitons à vous abonner à l'infolettre « À prop'eau » et à aller visiter notre site Internet.

3 SURVOL DU BILAN 2021

M. Richard Dallaire et Mme Caroline Jolette présentent le contenu de la fiche bilan pour l'année 2021. Celle-ci liste les réalisations (études, travaux, sondage, rencontres, etc.) du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et le résumé des conditions érosives.

La fiche bilan sera envoyée par courriel aux membres.

La présentation complète se trouve à l'annexe 2.

Questions/Commentaires	Réponses
C. Pelletier : Est-ce qu'une tendance à la hausse est observée au niveau des tempêtes printanières ? Y'en a-t-il plus qu'avant?	C'est très variable d'une année à l'autre et aucune observation de tendance n'a été faite. Il s'agit d'une variabilité naturelle.

4 SECTEURS SOUS SURVEILLANCE 2022

Mme Caroline Jolette trace le portrait des 20 secteurs sous surveillance. Ceux-ci sont déterminés grâce à l'arpentage annuel des plages, les requêtes de riverains et des suivis particuliers.

Elle invite les membres à proposer des secteurs à surveiller pour 2022. Aucun secteur n'est mentionné, mais l'invitation reste ouverte et elle rappelle que les suggestions peuvent être acheminées par courriel en tout temps à la suite de la rencontre.

La présentation complète se trouve à l'annexe 2.

5 MISE À JOUR SUR LA RÉALISATION DES SITES DE TRAVAUX ET PROCHAINES ÉTAPES

Mme Caroline Jolette présente la synthèse des travaux effectués à l'automne 2021 et l'hiver 2022, ainsi que les prochaines étapes prévues au printemps 2022. Elle rappelle que Rio Tinto demeure intéressé à recevoir des commentaires et des observations faites sur le terrain.

La présentation complète est disponible à l'annexe 2.

Questions/Commentaires	Réponses
L-P Chartier : Serait-il possible d'avoir des précisions sur les espèces exotiques présentes dans le secteur du camping Saint-Pierre et que Rio Tinto veut retirer? Quelles sont-elles?	Le ministère de l'environnement nous a demandé de les retirer à la suite de la déclaration de Rio Tinto et dû au fait que nous avions déjà la machinerie adaptée sur place. L'espèce en question est une essence d'érable, l'érable à Giguère, qui ne représente pas nécessairement une grande menace pour l'écosystème (précision de M. Luc Simard).

6 RETOUR SUR LE DOSSIER DE SAINT-GÉDÉON-SUR-LE-LAC ET DE LA BELLE-RIVIÈRE

M. Richard Dallaire et Mme Caroline Jolette détaillent la démarche de consultation qui est en cours ainsi que les résultats des suivis qui ont été faits dans ce secteur.

La présentation complète est disponible à l'annexe 2.

Questions/Commentaires	Réponses
H. Jobin : Dans la zone 5, il y a un gros ensablement. Est-ce que ça risque de dévier le tracé de la Belle-Rivière?	L'épi de 200 m construit dans ce secteur sert à capturer les matériaux et à réduire ce risque, et nous suivons la situation de près. Nous constatons davantage d'érosion que d'accumulation dans cette zone-là.
L. Ouellet : Félicitations aux gens de Saint-Gédéon-sur-le-Lac pour l'effort de concertation! Est-ce que la position de la municipalité est différente de celle de l'association ?	La municipalité est très sensible envers l'opinion des riverains qui voient que la situation s'améliore et qui ne veulent pas nécessairement d'intervention. Toutefois, elle l'est aussi aux enjeux de la marina, du camping, et des résidents du banc de sable à Métabetchouan qui veulent absolument maintenir le chenal et qui penchent donc vers une intervention.

C. Pelletier : En complément, je dirais que l'association est très mature dans sa prise de position et qu'ils souhaitent surtout prendre un pas de recul pour la prochaine année.	
P. Audet : Est-ce que le comité aviseur va avoir un compte-rendu des rencontres qui sont actuellement faites avec les riverains et la municipalité?	Oui, un suivi des rencontres sera fait verbalement au prochain comité aviseur.
P. Audet : Est-ce que le dragage a fait partie des échanges?	Oui. Cela a été abordé et il a été clarifié que ce sont des travaux en dehors du décret et que les différents enjeux techniques, environnementaux et sociaux soulevés par ce type d'intervention ne répondent pas aux objectifs fixés.
T. Tremblay : On parle beaucoup de considérations d'ordre social, mais est-ce qu'on considère également la meilleure solution d'un point de vue environnemental et de préservation de l'écosystème?	Oui, le volet environnement est considéré au même titre que les volets social et économique/technique. Depuis 1986, la mission du Programme de stabilisation des berges est de répondre à un besoin social en contrant l'érosion tout en appliquant les principes du développement durable.
P. Audet : Ce n'est pas nécessairement un environnement naturel (gestion du niveau du lac et nombreux travaux déjà effectués). Il est donc normal que la solution ne soit pas 100% naturelle non plus selon moi.	

7 QUESTIONS ET VARIA – PROCHAINES RENCONTRES ET SUJETS D'INTÉRÊT

Aucun n'est ajouté au varia qui était demeuré ouvert.

8 FIN DE LA RENCONTRE

M. Richard Dallaire remercie les membres pour leur présence et leur écoute. La rencontre se termine à 10 h 55.

Production du compte-rendu
Pier-Luc Dufour, Transfert Environnement et Société
Chargé de projets – Relations avec les communautés

ACTIONS DE SUIVI

Actions de suivi	Responsable	Échéancier
Transmettre à M. Louis Ouellet les prévisions de crue de la Belle Rivière	Jean Paquin/Richard Dallaire	Dès que possible
Envoyer la fiche bilan 2021	Richard Dallaire	Après la rencontre
Prévoir une présentation des résultats du sondage 2021	Catherine Doré	Prochaine rencontre
Transmettre le rapport de suivi annuel 2021	Richard Dallaire	Lorsque le MELCC aura donné son approbation

Annexe 1 : Liste de présences

Liste des présences de la rencontre du comité des parties prenantes 24 mars 2022

Parties prenantes

- Joëlle Guérin
- Louis Ouellet
- Denis Potvin
- Annie Brassard
- Jean-Yves Gaudreault
- David Cleary
- Laurent-Paul Chartier
- Claude Prévost
- Luc Simard
- Daniel Murray
- Patrick Courtois
- Hugues Jobin
- Claude Pelletier
- Tommy Tremblay
- Pierre Audet

Rio Tinto

- Richard Dallaire
- Caroline Jolette
- Jean Paquin

Transfert Environnement et Société (prise de note)

- Pier-Luc Dufour

Annexe 2 : Présentation
